

义深斜 13 探井项目

竣工环境保护验收调查报告表

建设单位：中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司
油气勘探管理中心

编制单位：山东胜丰检测科技有限公司

2026 年 7 月

义深斜 13 探井项目
竣工环境保护验收调查报告表

建设单位：中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管
理中心

法人代表：张鹏飞

编制单位：山东胜丰检测科技有限公司

法人代表：陈翠玲

报告编写人：宋金龙

建设单位：中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心（盖章）

编制单位：山东胜丰检测科技有限公司（盖章）

电话：0546-6378057

电话：0546-8966722

邮编：257000

邮编：257000

地址：山东省东营市东营区西四路胜建大厦

地址：东营市东营区蒙山路 7 号

目 录

表 1 建设项目基本情况	1
表 2 项目建设情况调查	6
表 3 环境影响评价回顾	29
表 4 环境保护措施效果调查	34
表 5 环境影响调查和监测	42
表 6 环评及环评审批决定的落实	47
表 7 验收调查结论	51
附件 1 委托书	54
附件 2 环评批复	55
附件 3 竣工公示	56
附件 4 泥浆处置单位资质	57
附件 5 钻井泥浆转运联单（部分）	58
附件 6 井下作业废液及压裂返排液转运联单（部分）	59
附件 7 验收检测报告	60
附件 8 验收检测现场照片	65
附件 9 其他需要说明的事项	66
附件 10 验收意见	71
附件 11 项目全本公示	83
附图 1 项目地理位置图	84
附图 2 周边关系图	85
建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表	86

表 1 建设项目基本情况

建设项目名称	义深斜 13 探井项目					
建设单位名称	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心					
建设项目性质	☒ 新建 ☐ 改扩建 ☐ 技改 ☐ 迁建 ☐ 其他					
建设地点	山东省滨州市海防办事处东五村西北 3.45km					
环境影响报告表名称	义深斜 13 探井项目环境影响报告表					
环境影响报告表编制单位	森诺科技有限公司					
初步设计单位	中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院					
环评审批部门	滨州市行政审批服务局	审批文号及时间	滨审批四表 [2024]380500019 号 2024 年 11 月 1 日			
初步设计审批部门	——	审批文号及时间	——			
设计单位	中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院	施工单位	中石化胜利石油工程有限公司渤海钻井总公司			
验收调查单位	山东胜丰检测科技有限公司	调查日期	2026 年 5 月 8 日			
设计生产规模	新钻义深斜 13 井 1 口，设计钻深 5033.11m	建设项目开工日期	2025 年 3 月 8 日			
实际生产规模	新钻义深斜 13 井 1 口，实际钻深 4932m	调试日期	——			
验收调查期间生产规模	完钻义深斜 13 井 1 口，实际钻深 4932m	验收工况负荷	已移交开发单位			
投资总概算（万元）	2517.0	环境保护投资总概算（万元）	142.4	比例	5.66	
实际总概算（万元）	2470	环境保护投资（万元）	135	比例	5.47	
项目建设过程简述（项目立项~调试）	1、2024 年 10 月，森诺科技有限公司编制完成了《义深斜 13 探井项目环境影响报告表》； 2、2024 年 11 月 1 日，滨州市行政审批服务局对《义深斜 13 探井项目环境影响报告表》进行了批复，批复文号为“滨审批四表[2024]380500019 号”（见附件 2）；					

	3、2025 年 3 月 8 日，项目开始施工；2025 年 8 月 27 日，项目完钻； 4、2025 年 8 月，项目开始试油作业；2026 年 4 月 28 日，试油结束，试油结果表明义深斜 13 探井具有开采价值，项目竣工，已移交开发单位； 5、2026 年 4 月 28 日，中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心（以下简称“勘探管理中心”）对该项目竣工日期在中国石化胜利油田网站（http://slof.sinopec.com）进行了公示（见附件 3）； 6、2026 年 4 月 29 日，勘探管理中心委托山东胜丰检测科技有限公司（以下简称“我公司”）进行该项目的竣工环保验收调查工作（见附件 1）； 7、2026 年 5 月 8 日，我公司进行验收现场调查，调查期间义深斜 13 探井已移交开发单位，探井钻井期、试油期污染物已得到有效处置，临时占地已进行了平整恢复，未造成环境污染； 8、2026 年 5 月 25 日，我公司对项目场地的土壤污染情况进行了采样，开展了现状监测； 9、2026 年 6 月，我公司完成了本项目竣工环境保护验收调查报告表的编制工作。
编制依据	1、法律法规及技术规范 1）《中华人民共和国生态环境法典》（2026 年 8 月 15 日） 2）《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日）； 3）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017 年 11 月 20 日）； 4）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日）； 5）《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日）； 6）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018 年 10 月 26 日）；

	7)《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019 年 1 月 1 日); 8)《中华人民共和国噪声污染防治法》(2022 年 6 月 5 日); 9)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020 年 9 月 1 日); 10)《中华人民共和国水土保持法》(2011 年 3 月 1 日); 11)《生态环境监测条例》(2026 年 1 月 1 日); 12)《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》(环办环评函[2019]910 号); 13)《建设项目环境保护管理条例》(2017 年 10 月 1 日); 14)《关于印发<地下水污染源防渗技术指南(试行)>和<废弃井封井回填技术指南(试行)>的通知》(环办土壤函(2020)72 号); 15)《山东省非道路移动机械排气污染防治规定》(2020 年 2 月 1 日施行); 16)《滨州市扬尘污染防治条例》(2020 年 1 月 1 日); 17)《山东省人民政府关于滨州市城市总体规划(2018—2035 年)的批复》(鲁政字[2019]8 号); 18)《滨州市人民政府办公室关于划定滨州市大气污染物排放控制区的通知》(滨政办字[2016]132 号); 19)《滨州市关于发布 2023 年生态环境分区管控动态更新成果的通知》(2024 年 4 月 25 日); 20)《滨州市国土空间总体规划(2021—2035 年)》(2023 年 10 月 31 日); 21)《滨州市生态环境局关于印发<滨州市生态环境准入清单(2022 版)>的通知》(滨环字[2023]30 号); 22)《滨州市水土保持规划(2017~2030 年)》(2017 年 12 月); 23)《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》(HJ/T 394-2007);
--	---

	24) 《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 生态影响类(征求意见稿)》(2018 年 9 月 25 日); 25) 《石油天然气开采业污染防治技术政策》(2012 年 3 月 7 日); 26) 《危险废物排除管理清单(2021 年版)》; 27) 《危险废物排除管理清单(2026 年版)》。 2、工程相关资料及批复 1) 《义深斜 13 探井项目环境影响报告表》(森诺科技有限公司, 2024 年 10 月); 2) 《中国石油化工股份有限公司油气勘探管理中心义深斜 13 井环境影响报告表的批复》(滨审批四表[2024]380500019 号, 2024 年 11 月 1 日); 3) 其他工程相关资料。
--	---

--	--

表 2 项目建设情况调查

工程建设内容：

1、项目背景

为了解渤南北带义深斜 13 块沙四下亚段砂砾岩体含油气情况，兼探沙四上，勘探管理中心进行了义深斜 13 井的钻探和试油工作。义深斜 13 井为评价井，主要为了获取相关技术参数，通过试油作业发现该井具备工业开采价值，目前已移交开发单位。

2、项目地理位置及周围环境概况

本项目建设地点位于山东省滨州市海防办事处东五村西北 3.45km，与环评设计位置一致。本项目依托现有井场进行建设，项目地理位置见附图 1。项目井场周围环境情况见附图 2。

3、建设内容

本项目实际建设内容主要包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程和依托工程。

表 2-1 项目工程组成表

因素			环评工程内容	实际建设内容
主体工程	施工期	钻前工程	项目选用 120m×100m 规格井场，临时占地面积 12000m ²	依托现有井场进行建设，未新增临时及永久占地
		钻井工程	新钻勘探井 1 口，井号为义深斜 13 探井，钻深合计 5033.11m	完钻勘探井 1 口，井号为义深斜 13，钻深 4932m
		试油工程	完井后对该井产能情况进行试油，本井试油阶段涉及的储层改造工程主要为压裂工艺，不涉及酸化工艺	完井后对该井产能情况进行试油，本井试油阶段涉及的储层改造工程主要为压裂工艺，不涉及酸化工艺
	封井期	-	把井场设备拆除，井口封存，清理井场等过程	已移交开发单位
辅助工程	供电工程	动力系统	4 台柴油发电机，单台功率不小于 800kW	4 台柴油发电机，单台功率 800kW
储运工程	钻井期	柴油罐	设置 2 座储量为 18t 柴油罐（1 用 1 备）	设置 2 座储量为 18t 柴油罐（1 用 1 备）
		钻井液循环罐	1 套，有效容积不小于 360m ³ ，含搅拌机	1 套，有效容积 360m ³ ，含搅拌机
		钻井固废拉运罐车	设置 3 辆 20m ³ 罐车拉运钻井固废	3 辆 20m ³ 罐车拉运钻井固废
	试油	柴油罐	设置 1 座 18t 柴油罐	设置 1 座 18t 柴油罐

	期	储液罐	设置 1 座 40m ³ 储液罐，用于暂存井下作业废液	设置 1 座 40m ³ 储液罐，用于暂存井下作业废液
		井下作业废液拉运罐车	设置 2 辆 20m ³ 罐车拉运井下作业废液	设置 2 辆 20m ³ 罐车拉运井下作业废液
公用工程	给排水	给水	本项目施工用水采用 2 辆 20m ³ 罐车拉运；试油期需进行通刮洗井和压裂作业，用水由附近站场及专业供水公司提供	项目施工用水采用罐车拉运，试油期用水由附近站场及专业供水公司提供
		排水	①井下作业废液由罐车拉运至河口采油厂渤三联合站采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层，无外排；②生活污水全部排至环保移动厕所，定期清运；③井场内雨水自然外排	①井下作业废液由罐车拉运至河口采油厂埕东废液站进行处理后进入采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层，无外排；②生活污水全部排至环保移动厕所，定期清运；③井场内雨水自然外排
	消防工程	井场消防	设置灭火器等消防设施	施工现场设置灭火器等消防设施
环保工程	废水	①井下作业废液、压裂返排液由罐车拉运至河口采油厂渤三联合站采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层，无外排；②生活污水排至环保厕所，由环保厕所供应单位定期回收处置		①井下作业废液、压裂返排液由罐车拉运至河口采油厂埕东废液站进行处理后进入采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层，无外排；②生活污水排至环保厕所，定期清运
	固废	①钻井过程采用“泥浆不落地”集中处理工艺，钻井固废属于一般工业固体废物，交由专业单位无害化处理；②施工期，在泥浆不落地设备区域和柴油储罐区铺设渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s 的防渗材料，沾油防渗材料循环利用，使用过程中如产生不可利用的废防渗材料（属于危险废物），统一委托有危险废物处理资质单位处置；③井场内设有 1 座危废贮存点，用于暂存设备保养产生的危险废物，废润滑油、废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用品产生后暂存于危废贮存点，委托有危险废物处理资质单位处置；④生活垃圾暂存于施工场地临时设置的垃圾桶内，由施工单位拉运至生活垃圾中转站后，由当地环卫部门统一处理		①钻井过程采用“泥浆不落地”集中处理工艺，钻井固废委托胜利油田东兴石油工程有限责任公司处理，处理后的泥饼交由东营熙林建筑工程有限公司综合利用；②在泥浆不落地设备区域和柴油储罐区铺设了渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s 的防渗材料，防渗材料循环利用，未产生不可利用的废防渗材料；③施工单位委托有危废处理资质的单位进行危废处理。本项目启动前已完成设备的基本维护，施工期间未产生废润滑油、废润滑油桶，废弃的含油抹布、废弃劳保用品；④钻井期生活垃圾由胜利油田万和石油工程技术有限责任公司进行清运、处理；试油期生活垃圾收

			集至中心垃圾点统一回收
	废气	①原材料运输、堆放要求遮盖；及时清理场地上弃渣料，采取加盖防尘网、洒水抑尘；②加强施工管理，尽可能缩短施工周期；保证设施正常运行，加强管理，减少非甲烷总烃的挥发	①原材料运输、堆放按要求进行了遮盖；对场地上的弃渣料及时进行了清理，采取了加盖防尘网、洒水抑尘等措施；②加强了施工管理，尽可能缩短了施工周期；③非道路移动机械使用了优质燃油，加强了设备和运输车辆的检修和维护；④试油期井场设置临时储油罐，试油期通过临时储油罐收集返排液，储油罐采用浸没式装车，鹤管距离罐底高度<20cm，装卸车时严格控制液体流速，在没有淹没进料管口和装卸即将结束前，液体的流速控制在 1m/s 以内，正常作业流速控制在 4.5m/s 以内
	噪声	①合理布置井位，尽量避开居民区等声环境敏感目标；②选用低噪声设备，加强设备维修保养；③压裂工程等高噪声设备施工前，通知周边人员，取得谅解	项目 200m 范围内无声环境敏感目标。本项目施工期选用了低噪声设备，整体设备安放稳固，柴油发电机安装消声器，各类机泵安装了减振基座，加强施工管理和设备维护，保证设备正常运转，制定了合理的施工计划，高噪声设备分开施工，加强了对运输车辆的管理及疏导，车辆行驶速度小于 5km/h，停车时立即熄火，压缩施工区汽车数量和行车密度，并控制汽车鸣笛
	生态	合理规划、尽量减少井场临时占地面积；区域施工现场尽量适时洒水，减少扬尘；施工结束后，及时对临时占地进行土地复垦	依托现有井场进行建设，未新增临时及永久占地，施工过程中施工现场适时洒水，减少了扬尘；施工结束后对施工场地进行了平整压实
依托工程	渤三联合站	井下作业废液、压裂返排液由罐车拉运至河口采油厂渤三联合站采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层，无外排	井下作业废液、压裂返排液由罐车拉运至河口采油厂埕东废液站进行处理后进入采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层，无外排

1) 钻井工程

(1) 主要建设内容

本次新钻义深斜 13 井 1 口，实际井深为 4932m，较环评设计减少 101.11m，井型及井别均无变化，根据现场调查，本项目钻井基本情况见表 2-2。

表 2-2 钻井基本情况表

阶段	井号	井别	井型	井深 (m)	备注
环评设计	义深斜 13	评价井	定向井	5033.11	井号、井别、井型均与环评设计一致，井深较环评设计减少 101.11m
实际建设	义深斜 13	评价井	定向井	4932	

(2) 井身结构

本项目采用三开井身结构，具体见表 2-3。

表 2-3 井身结构情况表

开钻次序	钻头尺寸 (mm)	井段 (m)	套管尺寸 (mm)	水泥返高 (m)
一开	Φ444.5	351	Φ339.7	地面
二开	Φ311.2	2778	Φ244.5	
三开	Φ215.9	4932	Φ139.7	

(3) 钻井设备

本项目采用 70 型钻机，主要钻井设备见表 2-4。

表 2-4 钻井设备一览表

序号	设备名称	规格型号	数量	单位
1	天车	最大静负荷 4500kN	1	台
2	游车大钩	最大钩载 4500kN	1	台
3	水龙头	最大静负荷 4500kN，最高工作压力 52MPa	1	台
4	转盘	开口直径 950 mm，最大静负荷 5850kN	1	台
5	井架	最大静负荷 4500kN	1	套
6	井架底座	钻台面高度 7.5 m、转盘梁最大静载荷 4500kN	1	套
7	动力系统	柴油机组（单台功率 800 kW）	4	台
8	钻井泵	单台功率 1176kW（1600HP）	3	台
9	钻井液循环罐	含搅拌机，有效容积 360m ³	1	个
10	振动筛	/	3	套
11	除砂器	单台处理量 180 m ³ /h	1	台
12	除气器	单台处理量 300 m ³ /h	1	台
13	除泥器	单台处理量 120 m ³ /h	1	台
14	离心机	单台处理量 60m ³ /h	2	台
15	钻井参数仪	/	1	套
16	顶驱	4500kN	1	套

(4) 钻井液消耗情况

本项目不同井段采用的钻井液体系有所不同，一开、二开、三开钻井过程主

要成分为土浆、钙处理钻井液、聚合物润滑防塌钻井液、复合盐润滑封堵防塌钻井液等，各种药剂按照比例在钻井现场进行配置。本项目采用的钻井液体系是以水为连续相配制钻井泥浆，根据《危险废物排除管理清单（2021年版）》，该过程中产生的废弃钻井泥浆及岩屑，不属于危险废物。项目施工期各药剂按照比例在钻井现场进行配置，并加强了施工现场对钻井液的管理，根据实际情况适时调整了用量，保证了钻井施工的安全进行，未发生事故。

（5）固井

经调查，钻井过程采用水泥（G级）进行了固井。水泥浆返至地面，固井质量良好。

本项目施工期现场照片见下图。



图 2-1 项目施工期现场照片

2）试油工程

试油就是利用专用的设备和方法初步确定的可能含油（气）层位进行直接的测试，并取得目的层的产能、压力、温度、油气水性质以及地质资料。

本井试油阶段主要涉及工序为压裂工艺，根据地质实际情况，项目不涉及酸化工艺。

（1）压裂工艺

本项目采用压裂技术，压裂液体系为滑溜水，属于水基压裂液。滑溜水压裂

液体系具有高效、低成本的特点，能够提高油层渗透率、增加导流能力、优化生产条件、减少地层伤害。

（2）试油设备

实际试油采用主要设备包括：通井机、水泥车、柴油发电机等，另外还有先进的井下工具：MFE 系列测试工具、APR 系列测试工具、膨胀封隔器系列测试工具、各种井下修井工具、各型支柱和卡瓦封隔器、各种电缆桥塞、液压桥塞、桥塞钻取工具、移动试油设施等。本项目试油过程在井口安装了 1 套采油树。

本次验收现场踏勘发现，试油设施已全部拆除，井队全部搬迁，试油设备均已撤出现场。根据建设单位提供资料，试油后发现该井具有开采价值，已移交开发单位。

3）钻井辅助作业

测井是把利用电、磁、声、热、核等物理原理制造的各种测井仪器，由测井电缆下入井内，使地面电测仪可沿着井筒连续记录随深度变化的各种参数。通过表示这类参数的曲线，来识别地下的岩层，如油、气、水层、煤层、金属矿床等。

取心是在钻井过程中使用特殊的取心工具把地下岩石成块地取到地面上来，这种成块的岩石叫做岩心，通过它可以测定岩石的各种性质，直观地研究地下构造和岩石沉积环境，了解其中的流体性质等。

录井是根据测井数据、现场录井数据及综合分析化验数据进行岩性解释、归位，确定含油、气、水产状。

测井、取心、录井主要就是取样分析地质等情况，该过程不涉及污染物产生。

4）辅助工程

（1）给排水

给水：施工期的生产用水包括钻井用水、试油用水。生产用水部分由罐车从附近站场拉运至施工现场，施工人员生活用水采用桶装车运提供。

排水：本项目施工期废水均未外排；井场内雨水自然外排。

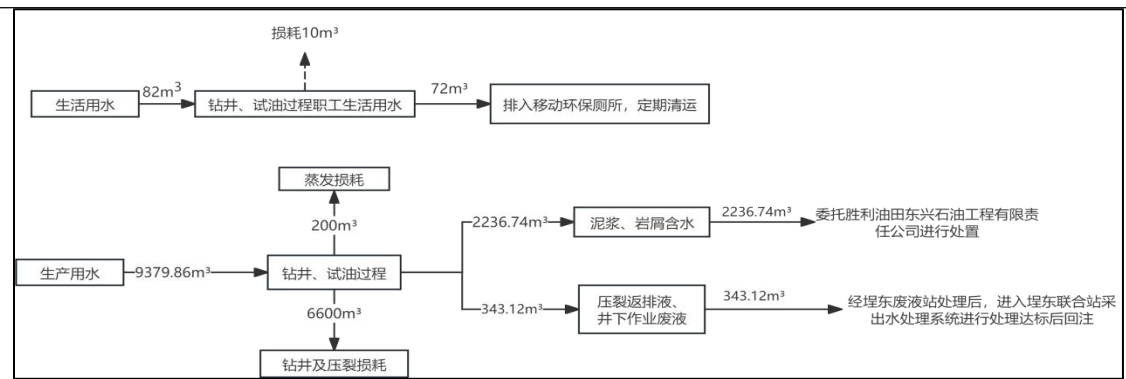


图 2-2 项目水平衡图

（2）供电

本项目施工过程采用柴油发电机（单台功率 800kW）供电；试油期采用柴油发电机发电。

5）依托工程

钻井过程产生的钻井固废采用“泥浆不落地”工艺进行处理，废弃泥浆及钻井岩屑拉运至胜利油田东兴石油工程有限责任公司进行处理，处理后的泥饼交由东营熙林建筑工程有限公司综合利用；处理后的废水依托埕东联合站采出水处理系统进行处理，处理达标后用于油田注水开发；井下作业废液及压裂返排液由罐车拉运至河口采油厂埕东废液站进行处理后进入采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层，无外排。

（1）胜利油田东兴石油工程有限责任公司

胜利油田东兴石油工程有限责任公司在井场设置了泥浆不落地处理装置。该装置通过高级振动筛和高速离心机进行固液分离，分离出的液相进入泥浆收集罐，拉运回集中处理站处理。拉回到集中处理站的泥浆依次经过配浆罐破乳、压滤分离等处理，分离出的固相交由东营熙林建筑工程有限公司进行综合利用，压滤出的废水进入油田联合站处理达标后回注地层，用于注水开发。经调查，胜利油田东兴石油工程有限责任公司运转正常，且处理能力（50 万吨/年）满足本次处理需求。

（2）埕东废液处理站

埕东废液处理站与埕东联合站合建，设计处理规模 480m³/d，目前实际处理量为 264m³/d，富余 216m³/d，采用碱液中和+微泡破胶装置处理工艺，处理后的废水进入埕东联采出水处理系统，处理达标后用于油田注水开发。施工期间，埕

东废液处理站实际处理量均未超出其设计处理规模，满足本项目处置要求。

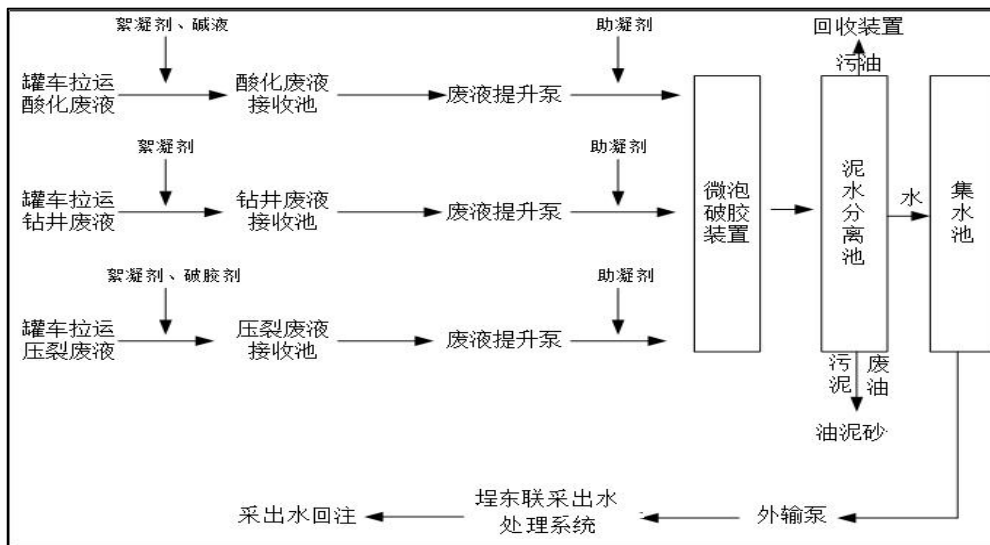


图 2-3 埕东废液处理站工艺流程图

（3）埕东联合站采出水处理系统

埕东联合站采出水处理系统与埕东联合站合建，采用两级重力除油工艺，设计处理规模为 $6.0 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，目前实际处理量约 $5.5 \times 10^4 \text{m}^3/\text{d}$ ，富余 $5000 \text{m}^3/\text{d}$ 。施工期间，埕东联合站采出水处理系统实际处理量均未超出其设计处理规模。埕东联合站工艺流程见图 2-4。

胜利油田定期对各采油厂采出水处理系统处理完的回注水，进行水质检测。经检测，埕东联合站采出水处理系统处理后的回注水能够达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标要求，详见表 2-5。

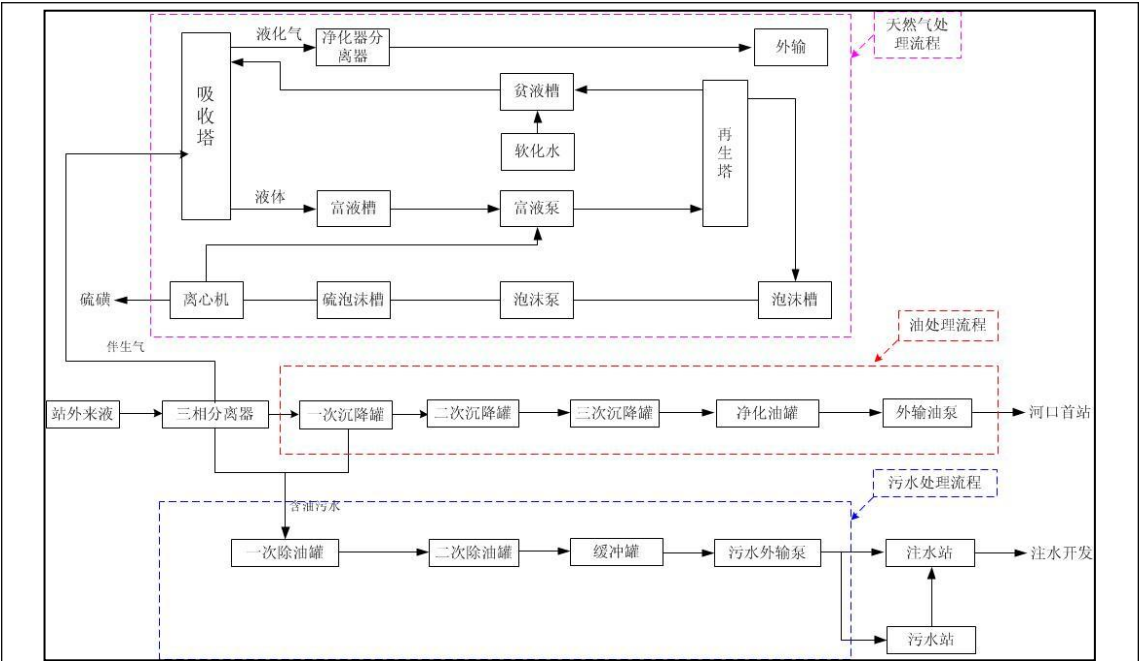


图 2-4 埕东联合站工艺流程图

表 2-5 回注水水质检测结果（2026 年 2 月）

站名	时间	含油量		悬浮固体含量		平均腐蚀率		悬浮物颗粒直径中值	
		mg/L		mg/L		mm/a		μm	
		实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值	标准值
埕东联合站	2026.02	8.4	≤10.0	5.0	≤15	0.007	≤0.076	2.4	≤5.0

本项目共产生井下作业废液和压裂返排液 343.12m³，已分批次拉运至埕东废液站、采出水处理系统，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层，无外排，依托可行。

工程占地及平面布置（附图）：

1、工程占地

本项目依托现有井场进行建设，未新增临时及永久占地。

表 2-6 项目占地情况一览表

项目	环评设计占地面积（m ² ）	实际新增占地面积（m ² ）	变化情况
井场	12000	0	较环评设计减少 12000m ²
占地类型	水域及水利设施用地	/	

	
2024 年 3 月天地图历史影像	2025 年 3 月天地图历史影像
	
2025 年 7 月天地图历史影像	2026 年 4 月天地图历史影像

图 2-5 项目各时期临时占地情况

2、平面布置

1) 钻井井场

本项目钻井井场主要包括井控房、动力设备、泥浆不落地设备、工具房、值班房等，完钻后已随钻井队搬走。钻井井场实际平面布置见图 2-6。


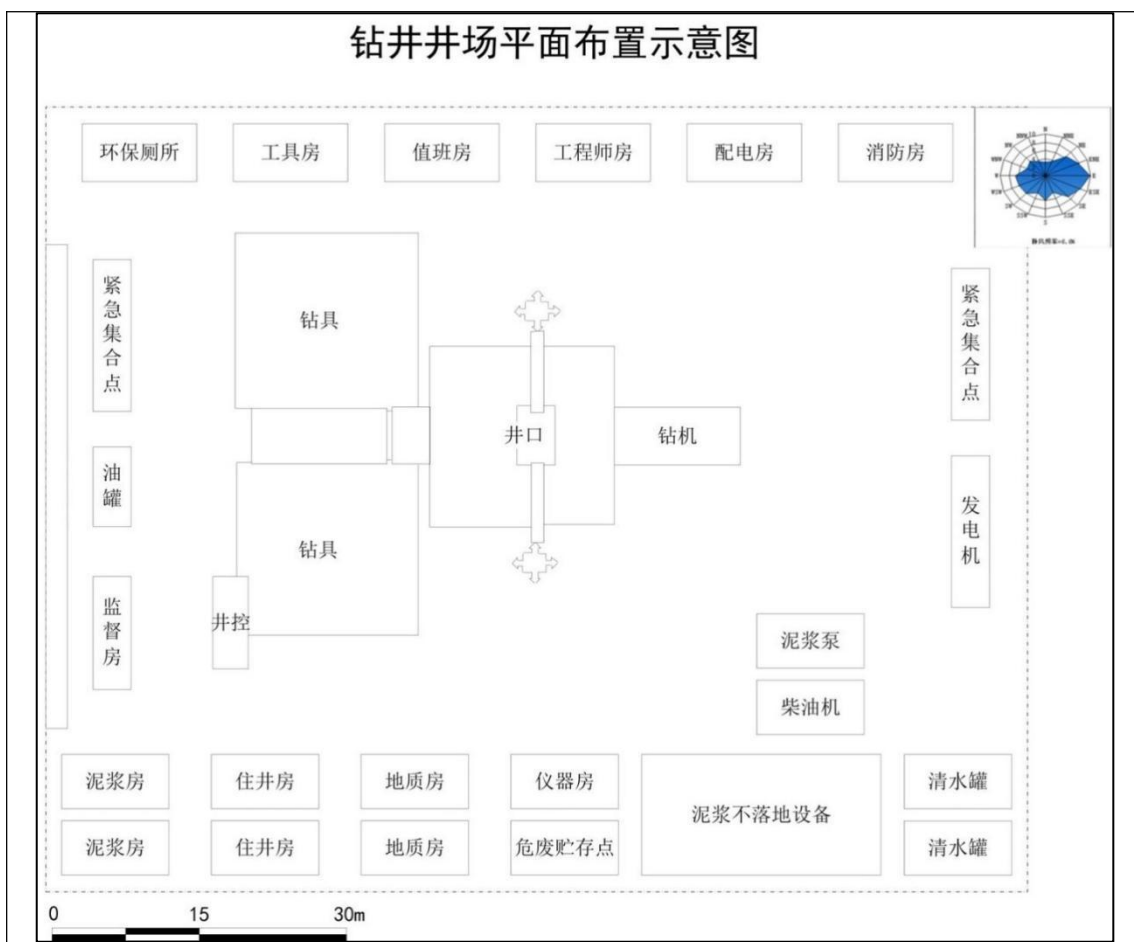


图 2-6 钻井井场平面布置示意图

2) 试油井场

本项目试油井场主要包括住井房、监督房等，试油后已随试油队搬走。试油期间平面布置图见图 2-7。

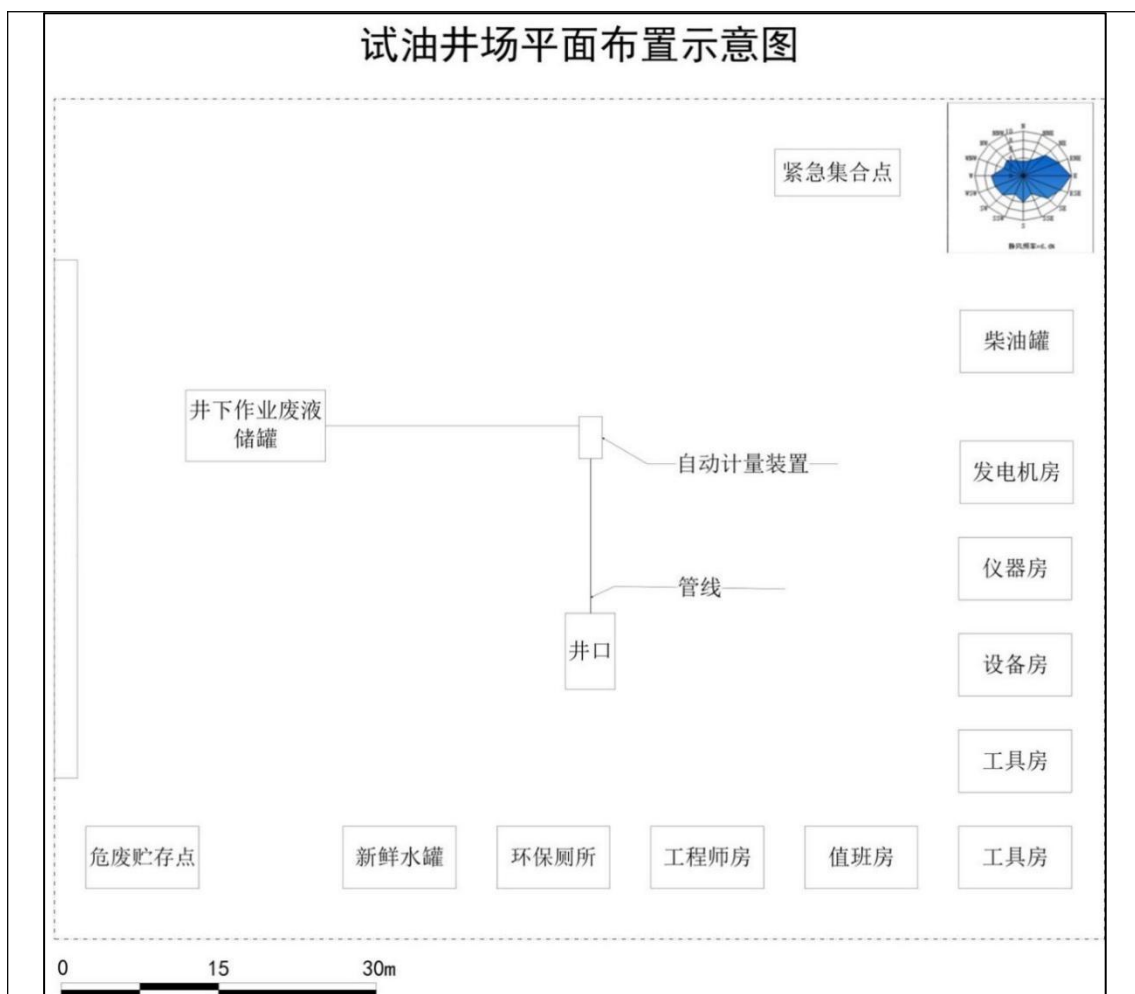

主要工艺流程（附流程图）：

1、钻井工艺

1) 钻前准备

(2) 钻机基础建设、钻井设备搬运及安装。

2) 钻进过程

下入表层套管深度后，及时进行下入表层套管、固井和试压作业。

封表层套管固井后再继续钻进。钻进中根据井内情况变化（钻速、钻井液性能、钻屑性能、钻井液体积和进出口流量等）和地面设备运转、仪表信息变化判断分析异常情况，及时采取相应处理措施。安全钻达下油层套管深度后，根据钻井设计要求，及时进行了测井、下入油层套管、固井等其他作业。

在钻井过程中，同时伴有地质录井作业。地质录井的任务主要是取全、取准各项地质资料及其有关的钻井施工资料。钻井过程中的地质录井工作包括钻时录井、钻井液录井、岩屑录井、岩心录井、压力录井等。

3) 钻井完井交接

钻井至目的层后，安装井口设备并与试油队办理了交接手续。同时，拆卸钻井设备并搬迁至下一口井。

经现场调查，钻井过程已结束，有关钻井设备全部搬走，未在井场存放。

2、试油工艺

试油主要是将钻井、综合录井、电测所认识和评价的含油气层，通过射孔、替喷、诱喷等多种方式，使地层中的流体（包括油、气和水）进入井筒，流出地面。从而取得地层流体的性质、各种流体的产量、地层压力以及流体流动过程中的压力变化等资料，并通过对这些资料的分析和处理获得地层的各种物性参数，对地层进行评价的工艺过程。具体钻井工艺和试油工艺过程详见图 2-8。

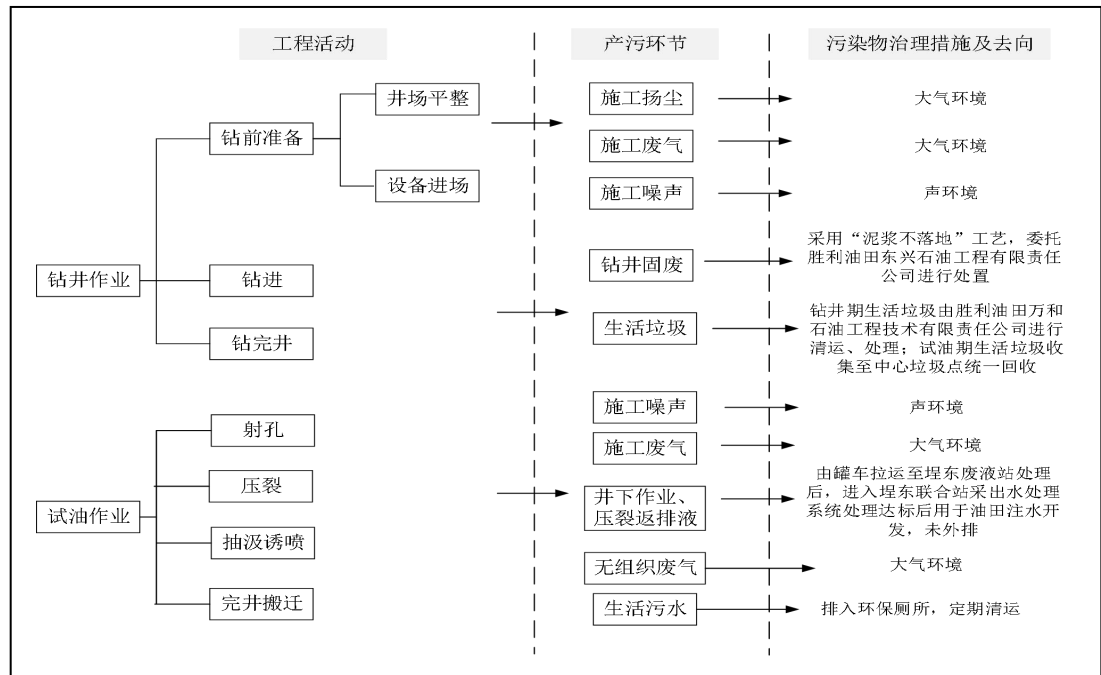


图 2-8 钻井及试油工艺流程及产污环节图

实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因

经现场调查和查阅资料，本项目实际工程量与环评阶段对比情况见表 2-7。

表 2-7 本项目实际建设内容与环评阶段对比变化情况表

因素			环评工程内容	实际建设内容	变化情况
主体工程	施工期	钻前工程	项目选用 120m×100m 规格井场，临时占地面积 12000m ²	依托现有井场建设，未新增临时及永久占地	新增占地较环评设计减少 12000m ²
		钻井工程	新钻勘探井 1 口，井号为义深斜 13 探井，钻深合计 5033.11m	完钻勘探井 1 口，井号为义深斜 13 探井，钻深 4932m	实际井深较环评设计减少 101.11m
		试油工程	完井后对该井产能情况进行试油，本井试油阶段涉及的储层改造工程主要为压裂工艺，不涉及酸化工艺	完井后对该井产能情况进行试油，本井试油阶段涉及的储层改造工程主要为压裂工艺，不涉及酸化工艺	无变化
	封井期	-	把井场设备拆除，井口封存，清理井场等过程	已移交开发单位	不涉及封井期
辅助工程	供电工程	动力系统	4 台柴油发电机，单台功率不小于 800kW	4 台柴油发电机，单台功率 800kW	无变化
储运工程	钻井期	柴油罐	设置 2 座储量为 18t 柴油罐（1 用 1 备）	设置 2 座储量为 18t 柴油罐（1 用 1 备）	无变化
		钻井液循环罐	1 套，有效容积不小于 360m ³ ，含搅拌机	1 套，有效容积 360m ³ ，含搅拌机	无变化
		钻井固废拉运罐车	设置 3 辆 20m ³ 罐车拉运钻井固废	3 辆 20m ³ 罐车拉运钻井固废	无变化
	试油期	柴油罐	设置 1 座 18t 柴油罐	设置 1 座 18t 柴油罐	无变化
		储液罐	设置 1 座 40m ³ 储液罐，用于暂存井下作业废液	设置 1 座 40m ³ 储液罐，用于暂存井下作业废液	无变化
		井下作业废液拉运罐车	设置 2 辆 20m ³ 罐车拉运井下作业废液	设置 2 辆 20m ³ 罐车拉运井下作业废液	无变化
	公用	给排水	本项目施工用水采用 2 辆 20m ³ 罐车	项目施工用水采用罐车拉运，试油期用水由	无变化

工程	水		拉运；试油期需进行通刮洗井和压裂作业，用水由附近站场及专业供水公司提供	附近站场及专业供水公司提供	
		排水	①井下作业废液由罐车拉运至河口采油厂渤三联合站采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层，无外排；②生活污水全部排至环保移动厕所，定期清运；③井场内雨水自然外排	①井下作业废液由罐车拉运至河口采油厂埕东废液站进行处理后进入采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层，无外排；②生活污水全部排至环保移动厕所，定期清运；③井场内雨水自然外排	井下作业废液处置地点发生变化
	消防工程	井场消防	设置灭火器等消防设施	施工现场设置灭火器等消防设施	无变化
环保工程	废水		①井下作业废液、压裂返排液由罐车拉运至河口采油厂渤三联合站采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层，无外排；②生活污水排至环保厕所，由环保厕所供应单位定期回收处置	①井下作业废液、压裂返排液由罐车拉运至河口采油厂埕东废液站进行处理后进入采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层，无外排；②生活污水排至环保厕所，定期清运处置	井下作业废液、压裂返排液处置地点发生变化
	固废		①钻井过程采用“泥浆不落地”集中处理工艺，钻井固废属于一般工业固体废物，交由专业单位无害化处理；②施工期，在泥浆不落地设备区域和柴油储罐区铺设渗透系数 $\leq 10^{-10}\text{cm/s}$ 的防渗材料，沾油防渗材料循环利用，使用过程中如产生不可利用的废防渗材料（属于危险废物），统一委托有危险废物处理资质单位处置；③井场内设有1座危废贮存	①钻井过程采用“泥浆不落地”集中处理工艺，钻井固废委托胜利油田东兴石油工程有限责任公司处理，处理后的泥饼交由东营熙林建筑工程有限公司综合利用；②在泥浆不落地设备区域和柴油储罐区铺设了渗透系数 $\leq 10^{-10}\text{cm/s}$ 的防渗材料，防渗材料循环利用，未产生不可利用的	①防渗材料循环利用，实际未产生废防渗材料；②实际未产生废润滑油、废润滑油桶，废弃的含油抹布、废弃劳保用品

		点,用于暂存设备保养产生的危险废物,废润滑油、废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用品产生后暂存于危废贮存点,委托有危险废物处理资质单位处置;④生活垃圾暂存于施工场地临时设置的垃圾桶内,由施工单位拉运至生活垃圾中转站后,由当地环卫部门统一处理	废防渗材料;③施工单位委托有危废处理资质的单位进行危废处理。本项目启动前已完成设备的基本维护,施工期间未产生废润滑油、废润滑油桶,废弃的含油抹布、废弃劳保用品;④生活垃圾由胜利油田万和石油工程技术有限责任公司进行清运、处理;试油期生活垃圾收集至中心垃圾点统一回收	
	废气	①原材料运输、堆放要求遮盖;及时清理场地上弃渣料,采取加盖防尘网、洒水抑尘;②加强施工管理,尽可能缩短施工周期;保证设施正常运行,加强管理,减少非甲烷总烃的挥发	①原材料运输、堆放按要求进行了遮盖;对场地上的弃渣料及时进行了清理,采取了加盖防尘网、洒水抑尘等措施;②加强了施工管理,尽可能缩短了施工周期;③非道路移动机械使用了优质燃油,加强了设备和运输车辆的检修和维护;④试油期井场设置临时储油罐,试油期通过临时储油罐收集返排液,储油罐采用浸没式装车,鹤管距离罐底高度<20cm,装卸车时严格控制液体流速,在没有淹没进料管口和装卸即将结束前,液体的流速控制在1m/s以内,正常作业流速控制在4.5m/s以内	无变化
	噪声	①合理布置井位,尽量避开居民区等声环境敏感目标;②选用低噪声设备,加强设备维修保养;③压裂工程等高噪声设备施工前,通知周边人员,取得谅解	项目200m范围内无声环境敏感目标。本项目施工期选用了低噪声设备,整体设备安放稳固,柴油发电机安装消声器,各类机泵安装了减振基座,加强施工管理和设备维护,保证设备正常运转,制定了合理的施工计划,高噪声设备分开施工,加强了对运输车辆的管理及疏导,车辆行驶速度小于5km/h,停车时立即	无变化

			熄火, 压缩施工区汽车数量和行车密度, 并控制汽车鸣笛	
	生态	合理规划、尽量减少井场临时占地面积; 区域施工现场尽量适时洒水, 减少扬尘; 施工结束后, 及时对临时占地进行土地复垦	依托现有井场进行建设, 未新增临时及永久占地, 施工过程中施工现场适时洒水, 减少了扬尘; 施工结束后对施工场地进行了平整压实	无变化
依托工程	渤三联合站	井下作业废液、压裂返排液由罐车拉运至河口采油厂渤三联合站采出水处理系统处理, 达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T 5329-2022)中水质主要控制指标后回注地层, 无外排	井下作业废液、压裂返排液由罐车拉运至河口采油厂埕东废液站进行处理后进入采出水处理系统处理, 达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T 5329-2022)中水质主要控制指标后回注地层, 无外排	井下作业废液、压裂返排液处置地点发生变化

本项目实际建设内容与环评阶段对比变化情况及变化原因见表 2-8。

表 2-8 实际变化情况及变化原因表

序号	主要变化情况		变化原因
1	井深	实际钻深减少 101.11m	地下油藏具有隐蔽性, 根据实际含油储层位置、厚度、工程施工难度等调整了井深
2	投资	实际总投资较环评阶段减少了 47 万元, 环保投资较环评阶段减少了 7.4 万元	井深减少, 总投资、环保投资相应减少
3	占地面积	环评设计占地面积为 12000m ² , 实际未新增占地面积	依托现有井场进行建设
4	环保措施	①井下作业废液、压裂返排液处置地点由渤三联合站调整为埕东联合站; ②实际未产生废沾油防渗材料、废润滑油、废润滑油桶, 废弃的含油抹布、废弃劳保用品	①根据实际情况, 调整了井下作业废液、压裂返排液的处置地点, 但处理效果未变, 均依法合规处置, 能够满足环评及批复的相关要求; ②防渗材料循环利用, 实际未产生废防渗材料; ③项目启动前已完成设备的基本维护, 施工期间未产生废润滑油、废润滑油桶, 废弃的含油抹布、废弃劳保用品

参照《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》(环办环评函[2019]910 号)可知, 本项目不存在重大变动, 具体见表 2-9。

表 2-9 与环办环评函[2019]910 号文对比分析表

序号	要求	项目情况	是否为重大变动
1	陆地油气开采区块项目环评批复后，产能总规模、新钻井总数量增加 30%及以上	实际新钻井 1 口，与环评阶段保持一致，新钻井总数量未增加，本项目为勘探井不涉及产能	否
2	回注井增加	不涉及回注井	否
3	占地面积范围内新增环境敏感区	占地面积范围内无新增环境敏感区	否
4	井位或站场位置变化导致评价范围内环境敏感目标数量增加	建设与环评一致	否
5	开发方式、生产工艺、井类别变化导致新增污染物种类或污染物排放量增加	不涉及因开发方式、生产工艺、井类别变化导致新增污染物种类或污染物排放量增加的情况	否
6	与经批复的环境影响评价文件相比危险废物实际产生种类增加或数量增加、危险废物处置方式由外委改为自行处置或处置方式变化导致不利影响加重	项目实际未产生危废	否
7	主要生态环境保护措施或环境风险防范措施弱化或降低	主要生态环境保护措施和环境风险防范措施无弱化和降低	否

生态保护工程和设施（附平面布置图）

经调查，本项目采取的生态保护工程和设施如下：

1、合理规划井位，依托现有井场进行建设，减少占地，减轻了对生态环境的影响；

2、井场建设时，建立了环境监督制度，监督指导施工落实了生态保护措施，在工程实施过程中，严格按照国家、地方等相关环境法律法规及设计方案进行施工，做到了工序紧凑、有序，缩短工期，井场四周未出现超挖现象；

3、本项目钻井作业过程严格控制施工作业范围，无人为破坏用地以外植被，施工单位提高施工人员对野生动物的保护意识，未发生捕杀野生动物的行为；

4、施工井场采用了洒水降尘等措施，减少扬尘扩散；施工过程中产生的固体废物得到了妥善处置，未将废弃泥浆、生活污水等排入周边水体，未在水体内清洗钻具；

5、施工现场未发现乱堆、乱放现象，施工结束后对施工场地进行了平整压

实。

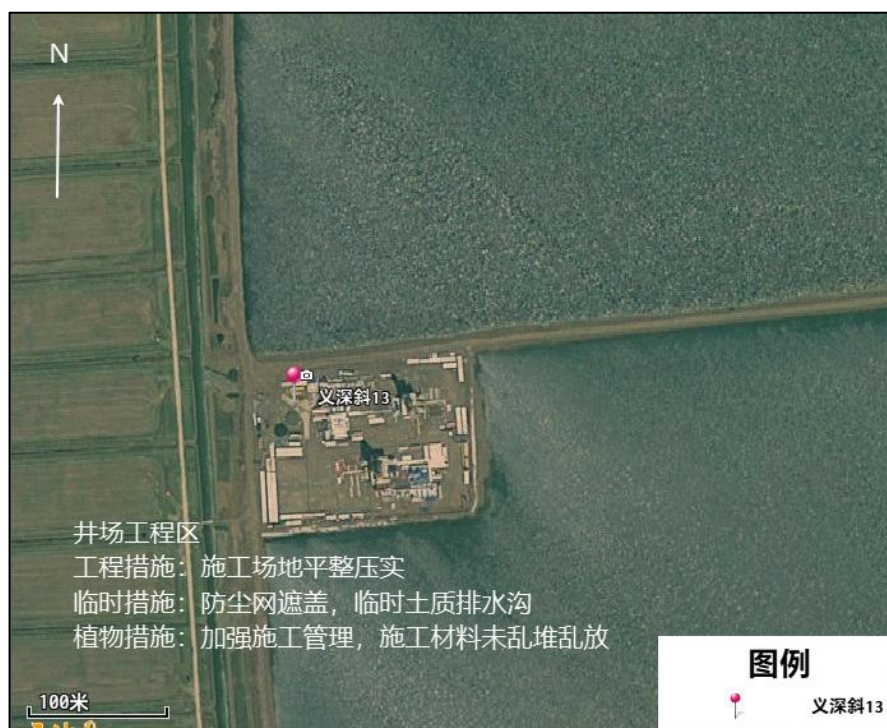


图 2-9 生态保护工程平面布置图

污染防治和处置措施

1、施工期污染物排放情况

1) 废气

本项目施工期大气污染物主要包括施工扬尘和施工废气。

(1) 施工扬尘

本项目施工扬尘主要产生于：井台建设、车辆运输过程。施工单位制定了合理化管理制度，加强管理，采取了控制施工作业面积、硬化施工道路和井场、洒水降尘、控制车辆装载量等措施、四级及以上风力停止土方运输、土方开挖、土方回填以及其他可能产生扬尘污染的施工作业，有效控制施工扬尘等措施。

(2) 施工废气

本项目施工期间产生的施工废气主要为钻运输车辆尾气、柴油机尾气及试油期井场无组织挥发废气。

①柴油机尾气

钻井过程中钻机等设备用电由大功率柴油发电机提供，其运转时向大气中排放了少量燃油废气，主要的污染物为总烃、NO_x、SO₂、烟尘等。经调查，钻井

单位制定了《设备管理制度》，柴油机等非道路移动机械设备已备案并取得环保号码，并对这些设备加强管理和维修保养，使用优质燃料，添加助燃剂，实际对大气环境产生的影响较小。



图 2-10 设备环保编码

②运输车辆尾气

项目钻井期施工车辆在进行施工活动时产生了少量燃油废气，主要污染物为 SO_2 、 NO_x 、 C_mH_n 等。经调查，钻井单位制定了《设备管理制度》，柴油机等非道路移动机械设备已备案并取得环保号码，并对这些设备加强管理和维修保养，使用优质燃料，添加助燃剂，实际对大气环境产生的影响较小。

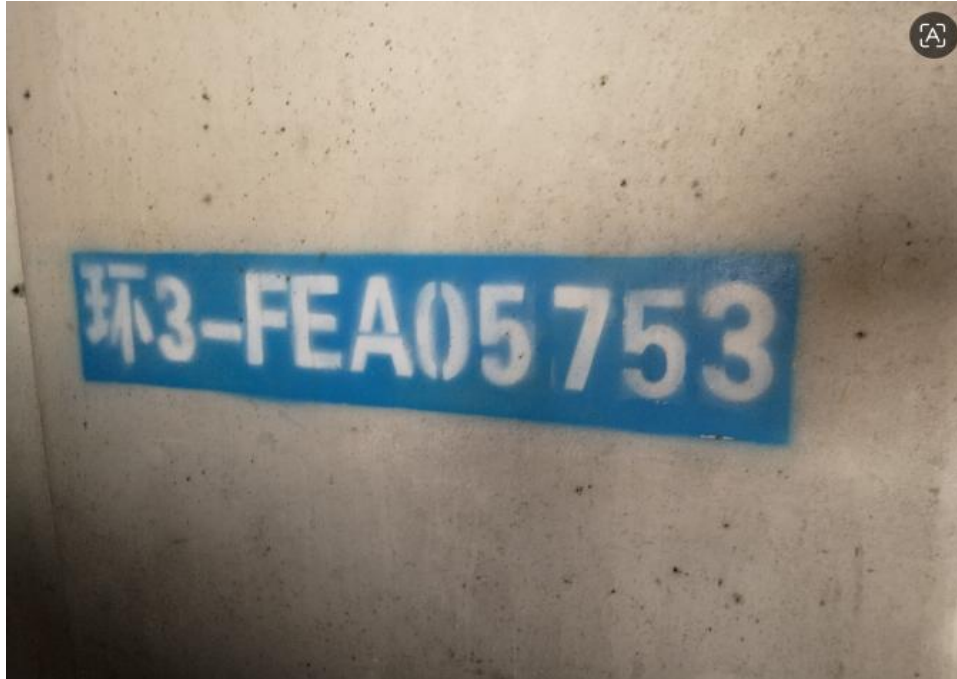


图 2-11 非道路移动机械环保编码

③试油期井场无组织挥发废气

试油期井场设置临时储油罐，储油罐装车以及试油过程均会有轻烃无组织挥发。经调查，试油期通过临时储油罐收集返排液，储油罐采用浸没式装车，鹤管距离罐底高度 $<20\text{cm}$ ，装卸车时严格控制液体流速，在没有淹没进料管口和装卸即将结束前，液体的流速控制在 1m/s 以内，正常作业流速不超过 4.5m/s 。高温天气（8-9 月份）上午 10 点到下午 4 点不装车。在运输过程中匀速行驶；同时加强了对驾驶员环境保护知识的宣传和培训。采取以上措施后，极大地减少了非甲烷总烃挥发量，并可防止产生静电和液体冒顶溢流，有效降低轻烃无组织挥发量。

2) 水污染物

施工期间产生的废水主要为井下作业废液、压裂返排液和生活污水。

(1) 井下作业废液及压裂返排液

井下作业废液和压裂返排液主要污染物为悬浮物、COD。经调查可知，本项目井下作业废液及压裂返排液共产生 343.12m^3 ，由罐车拉运至河口采油厂埕东废液站进行处理后进入采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层，无外排。

（2）生活污水

本项目施工期产生的生活污水，主要污染物为悬浮物、氨氮、COD，全部排入移动厕所，定期清运处置，未排入外环境。



图 2-12 施工现场环保厕所照片

3) 固体废物

（1）钻井固废

本项目采用“泥浆不落地”工艺，钻井过程中使用了水基泥浆，钻井固废主要包括钻井过程中无法利用或钻井完工后的废弃泥浆和岩屑，拉运至胜利油田东兴石油工程有限责任公司进行处理（联单见附件 5），钻井固废拉运量共计 2236.74m³，处理后的泥饼交由东营熙林建筑工程有限公司综合利用。泥浆不落地装置实现了泥浆收集，避免新的有害材料的添加和增量，实现了对钻井废弃物的现场减量化及无害化处理。

（2）生活垃圾

本项目钻井期生活垃圾（22 桶）由胜利油田万和石油工程技术有限责任公司进行清运、处理；试油期生活垃圾（259kg）收集至中心垃圾点统一回收。

4) 噪声

钻井期噪声源主要是钻机、柴油发电机、钻井泵，其源强为 80dB（A）～100dB（A）。本项目施工期井场设备布局合理，选用了低噪声设备，整体设备安放稳固，柴油发电机安装消声器，各类机泵安装了减振基座，加强施工管理和设备维护，保证设备正常运转，制定了合理的施工计划，高噪声设备分开施工，并且安排在昼间，加强了对运输车辆的管理及疏导，车辆行驶速度小于 5km/h，停车时立即熄火，压缩施工区汽车数量和行车密度，并控制汽车鸣笛。

2、运营期污染物排放情况

本项目不涉及运营期。

工程环境保护投资

本项目实际总投资 2470 万元，环保投资 135 万元。环保投资主要包括废气治理、废水治理、噪声治理、固体废物治理及环境管理等方面。环境保护实际投资情况见表 2-10。

表 2-10 环境保护实际投资

序号	环保设施		环评投资 估算（万元）	实际环保投资（万元）
1	废水处置	生活污水处置	0.3	0.5
		井下作业废液、压裂返排液处理	51.9	47.5
2	废气处置	施工现场和道路进行硬化，采取了洒水、围挡、遮盖措施、物料集中堆放并采取遮盖、设备维修保养等措施	0.8	1.0
3	固体废物处置	泥浆不落地系统	71.2	68.5
		生活垃圾收集清运		
4	生态与水土保持	降尘、防水土流失；应急监测	7.2	4.5
5	噪声治理	选用低噪声设备；整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，安装消音隔音设施，高噪声设备加装减振支垫	7.0	5
6	风险防范	风险防范物资，应急监测，井场防渗	4.0	3
7	评价费用	环评报告编制、验收报告编制等费用	/	5
合计			142.4	135

表 3 环境影响评价回顾

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

建设项目环境影响报告表主要结论：

本项目符合国家有关产业政策。在严格执行已有各项环保政策、规定的基础上，认真落实本报告表中提出的环保措施与建议的前提下，从环境保护角度分析，本项目的建设可行。

生态环境主管部门的审批意见：

滨审批四表[2024]380500019 号

审批意见：

你公司关于《中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心义深 13 井环境影响报告表》收悉。根据评价结论和专家审查意见，并经局长办公会研究通过，批复如下：

根据森诺科技有限公司对该项目开展环境影响评价的结论、专家评审意见和复审意见，在全面落实报告表提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下，工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施。

一、在项目建设与生产管理中，你公司应认真对照并落实报告表提出的各项环保对策措施。

二、该项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，进行竣工环境保护验收，经验收合格后方可投入正式生产。

三、该项目的环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、该项目涉及的经济综合管理、规划、建设、土地等其他事项，你单位应遵照有关部门要求执行。

滨州市行政审批服务局

2024 年 11 月 1 日

验收执行标准:

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油天然气开采》（HJ 612-2011）、《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T 394-2007），并参考《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 生态影响类（征求意见稿）》（2018年9月25日）的要求，本项目竣工环境保护验收时环境质量标准执行现行有效的标准。

1、环境质量标准

表 3-1 环境质量标准

项目	环评执行标准	现行及验收执行标准
环境空气	执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及其修改单（生态环境部公告 2018 年 第 29 号）二级浓度限值	验收期间 SO ₂ 、NO ₂ 、PM ₁₀ 、PM _{2.5} 、CO、臭氧等基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中二级标准
地表水	挑河执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的V类水域标准	挑河执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）V类标准
地下水	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的III类标准	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的III类标准，石油类指标参考《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的III类水域标准
声环境	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的 2 类声环境功能区环境噪声限值	《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的 2 类声环境功能区环境噪声限值
土壤	执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 1 中筛选值	井场外执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表 1 中筛选值，井场内执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中的第二类建设用地土壤污染风险筛选值，井场外石油烃参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第一类建设用地土壤污染风险筛选值

2、污染物排放标准

根据《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 生态影响类（征求意见稿）》（2018年9月25日）中“8.3（验收执行标准）”的要求，本项目竣工环境保护验收污染物排放标准参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月15日）执行。

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018 年 5 月 15 日）中“6.2（污染物排放标准）”：“建设项目竣工环境保护验收污染物排放标准原则上执行环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定所规定的标准。在环境影响报告书（表）审批之后发布或修订的标准对建设项目执行该标准有明确时限要求的，按新发布或修订的标准执行。特别排放限值的实施地域范围、时间，按国务院生态环境主管部门或省级人民政府规定执行。建设项目排放环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中未包括的污染物，执行相应的现行标准”。

表 3-2 本项目污染物排放标准

阶段	环评及批复标准		现行及验收执行标准	
	执行标准	限值	执行标准	限值
废气	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 限值	颗粒物 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 限值	颗粒物 $\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3$
	《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37 /2801.7-2019）	非甲烷总烃无组织排放 $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$	《挥发性有机物排放标准 第 7 部分：其他行业》（DB37 /2801.7-2019）	非甲烷总烃无组织排放 $\leq 2.0\text{mg}/\text{m}^3$
噪声	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）	昼间 70dB（A）夜间 55dB（A）	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）、《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）	昼间 70dB（A）夜间 55dB（A）
废水	《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标		《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标	
固体废物	一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中相关要求		一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；本项目施工期未产生危险废物	

验收调查的范围、目标、重点和因子等：

1、调查范围

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T 394-2007）和《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 生态影响类（征求意见稿）》的要求，本工程竣工环境保护验收的调查范围与环评设计一致，生态环境影响评价范围为厂界周围 50m 范围。

现场调查期间，本工程试油期已结束，获取了相关技术参数，义深斜 13 井

已移交开发单位。本次验收仅对钻井过程、试油期进行验收。结合工程特点，本次验收调查内容具体见表 3-3。

表 3-3 调查内容一览表

调查对象	调查项目	调查内容
项目区生态影响情况	环境保护目标	调查范围内是否存在生态环境保护目标及对其影响
	占地情况	调查项目占地类型、面积
	对动植物影响	调查项目建设对调查范围内动植物产生的影响
项目区污染物影响情况	废气	调查项目废气产生情况及防治措施
	废水	调查项目废水产生及处理情况
	噪声	调查项目噪声产生情况及防治措施
	固废	调查项目固废产生及处理情况
钻井工程	核实建设内容	核实项目井位、实际井深、目的层、井别等情况
环保措施落实情况	环保措施	调查项目环保措施落实情况
环境风险	突发环境事件	调查项目施工过程中是否发生突发环境事件，是否建立应急措施

2、调查目标

项目位于山东省滨州市海防办事处东五村西北 3.45km，与环评设计位置一致。根据《滨州市国土空间总体规划（2021-2035 年）》（2023 年 10 月 31 日），本项目所在位置不在生态保护红线区内，最近的生态保护红线区位于本项目北侧 11.5km 处，符合生态保护红线规划要求。本项目主要环境保护目标见表 3-3，与环评阶段一致。

本项目主要环境保护目标见表 3-3。

表 3-3 验收阶段与环评阶段主要环境保护目标对比表

类型	敏感目标	相对方位	距离（km）	环境要素及保护级别
地表水	挑河	E	4.1	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）V 类
地下水	周围地下水	/	/	《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准；石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准
土壤环境	周边农田	/	/	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）；石油烃参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）
生态环境	黄河三角洲生物多样性维护生态	N	11.5	/

	保护红线			
3、调查重点 根据项目环评及批复文件，确定本工程竣工环境保护验收的重点是工程变更情况、生态保护工程和设施实施运行情况、污染防治和处置设施落实情况、环境风险调查、风险事故防范措施落实情况以及钻井和试油期是否发生突发环境事件。 4、调查因子 1) 生态环境影响调查 主要调查工程占地情况、工程防护和水土流失情况、钻井过程对植被影响情况。 2) 大气环境影响调查 主要调查本项目废气排放对周围环境的影响及大气污染防治措施的落实情况。 3) 水环境影响调查 主要调查本项目废水产生排放及污染防治措施落实情况。 4) 土壤环境影响调查 pH、石油烃共 2 项（井场内、外）。 5) 固体废物 主要调查项目钻井过程、试油期间产生固体废物的处置情况。 6) 环境风险 建设单位针对本项目制定的风险防范措施、应急预案。				

表 4 环境保护措施效果调查

验收调查工况：

本次验收调查仅针对钻井期和试油期，且都已结束，不涉及转生产井后的运营期。目前，义深斜 13 井已经完成钻井和试油，试油后发现该井具有开采价值，项目施工完成，已移交开发单位。施工结束后对施工场地进行了平整压实，效果良好，未造成环境污染，具备竣工环境保护验收的条件。

生态保护工程和设施实施运行效果调查：

本项目依托现有井场进行建设，实际项目施工未新增临时及永久占地。经现场调查，项目井场周围为养殖池，实际施工过程中采取了以下措施：

钻井、试油作业过程均在划定的施工作业范围内进行；制定了有关环保制度；项目产生的生活垃圾、钻井固废等固体废物得到了妥善处置；钻井施工过程做好了防渗工作，加强了施工管理，油品存放远离周边养殖池；车辆、设备加油远离周边养殖池，施工过程中加强了对施工机具的维护，无漏油现象发生；试油期试油队采用船型围堰，避免了试油时对周围养殖池的影响。

验收调查期间，项目占地范围外未发现植被破坏和车辆乱碾乱压状况、井场四周不存在超挖现象、施工现场未发现乱堆、乱放现象，且施工场地得到了清理，目前施工场地已进行了平整压实。

项目实际采取的环保措施符合环评要求，避免了植被破坏、水土流失等生态影响，能够达到保护生态环境的效果。项目井场恢复情况见图 4-1。



图 4-1 项目井场现状图

污染防治和处置设施效果监测：

1、废气污染防治和处置措施效果

1) 施工扬尘污染防治措施效果

经资料收集可知，施工单位制定了合理化管理制度，加强管理，施工期严格控制了施工作业面积、采取了控制硬化施工道路和井场、洒水降尘、控制车辆装载量、遮盖土堆和建筑材料、四级及以上大风天气停止作业等措施，并加强了对运输车辆的管理及疏导，车辆行驶速度小于 5km/h，停车时立即熄火，施工扬尘未对项目周围环境空气造成不利影响。

2) 施工废气污染防治措施

经调查，施工单位制定了《设备管理制度》，对各类设备加强维修保养；同时选用了高品质柴油及添加柴油助燃剂，同时压缩施工区汽车数量和行车密度，均有效降低了施工废气，经资料收集及实际调查可知，项目实际严格落实了环评中大气污染防治措施，有效降低了对大气的污染；试油期通过临时储油罐收集返排液，储油罐采用浸没式装车，装卸车时严格控制液体流速；经资料收集及实际调查可知，项目实际严格落实了环评中大气污染防治措施，有效降低了对大气的污染。

2、水污染防治效果

井下作业废液及压裂返排液拉运至埕东废液处理站进行处理后进入采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层，无外排。

3) 生活污水

本项目施工期现场设环保厕所，生活污水排入环保厕所，定期清运，未直接外排于区域环境。

经资料收集及实际调查可知，项目实际严格落实了环评中水污染防治措施，废水都已转运、处理，未造成环境污染，没有环境遗留问题。

3、噪声污染防治效果

经现场调查，项目 200m 范围内无声环境敏感目标。本项目施工期选用了低噪声设备，整体设备安放稳固，柴油发电机安装消声器，各类机泵安装了减振基座，加强施工管理和设备维护，保证设备正常运转，制定了合理的施工计划，高

噪声设备分开施工,加强了对运输车辆的管理及疏导,车辆行驶速度小于 5km/h,停车时立即熄火,压缩施工区汽车数量和行车密度,并控制汽车鸣笛。

经资料收集及实际调查可知,项目按照环评要求落实了噪声污染防治措施。因此,本项目对周围声环境的影响较小。

4、固体废物处置效果

1) 钻井固废

本项目采用“泥浆不落地”工艺,钻井过程中使用了水基泥浆,钻井固废主要包括钻井过程中无法利用或钻井完工后的废弃泥浆和岩屑,收集的废弃泥浆和岩屑拉运至胜利油田东兴石油工程有限责任公司进行处理,处理后的泥饼交由东营熙林建筑工程有限公司综合利用。泥浆不落地装置实现了泥浆收集,避免新的有害材料的添加和增量,实现了对钻井废弃物的现场减量化及无害化处理。

2) 生活垃圾

项目钻井期生活垃圾由胜利油田万和石油工程技术有限责任公司进行清运、处理;试油期生活垃圾收集至中心垃圾点统一回收。经资料收集及实际调查可知,项目按照环评要求落实了固废治理措施,设备都已搬迁,未造成环境污染,也未产生环境遗留问题。井场作业区、生活区及周边卫生环境比较清洁,无零星垃圾散布现象,井场周围植被恢复情况较好。

5、其他污染防治措施

1) 钻井液配制材料均存放在材料房内,实行“下垫上盖”方案,并且按照不同名称进行分类标识。

2) 施工期在油罐区、配浆用水池区、泥浆不落地装置区、钻具区等重点防渗区铺设了渗透系数 $\leq 10^{-10}$ cm/s 的防渗材料,防渗材料循环利用。

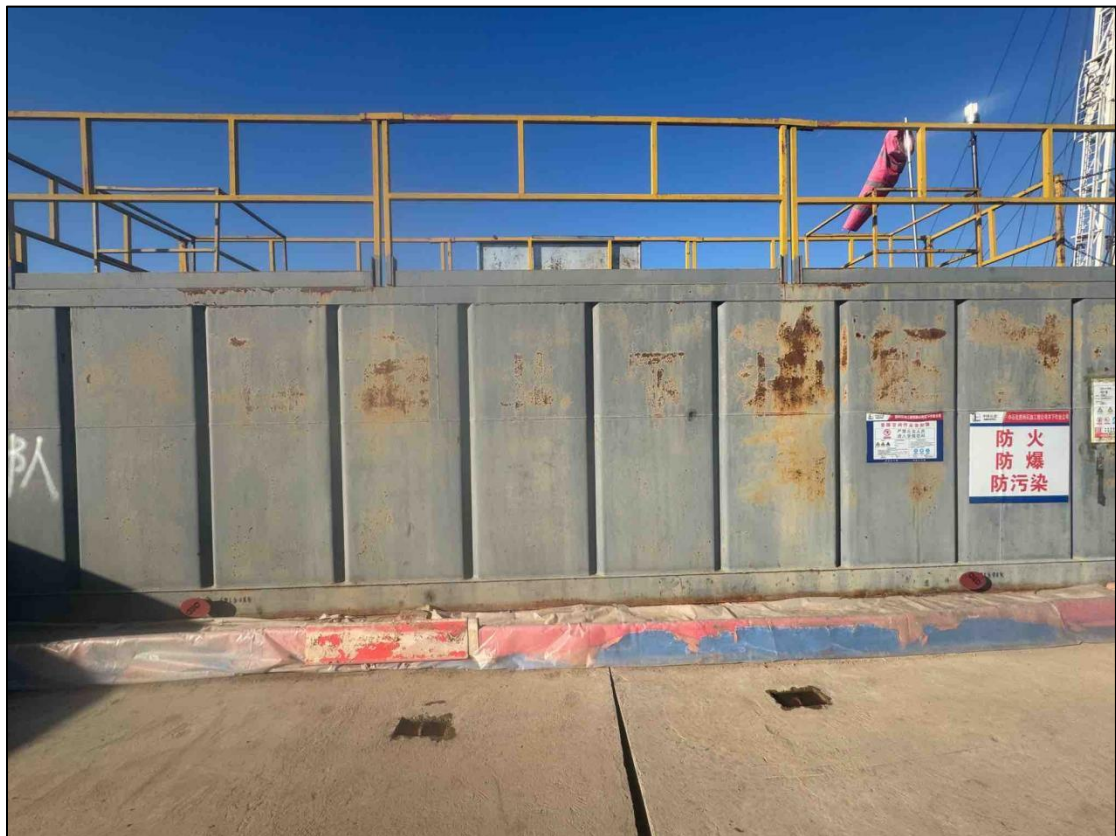


图 4-2 项目防渗措施现场照片

其他环境保护设施效果调查：

1、环境风险因素调查

本项目已完钻，经实地调查，钻井及试油过程中均未发生突发环境事件。

2、环境风险防范措施调查

1) 井喷风险防范措施

井喷风险防范措施主要在施工设计、钻井作业及安装防井喷装置三个方面进行。

(1) 施工设计中的防井喷措施

①选择了合理的压井液。新井投产和试油施工参照钻穿油层时钻井泥浆性能，认真选择了合理的压井液，避免了因压井液性能达不到施工要求而造成井喷污染；

②选择了合理的射孔方式；

③规定了上提钻具的速度。井内下有大直径工具（工具外径超过油层套管内径 80%以上）的井，严禁高速起钻，防止因高速起钻引起抽汲作用造成井喷污染。

(2) 钻井作业中的井喷防范措施

①开钻前已向全队职工、钻井现场的所有工作人员进行地质、工程、钻井液和井控装备等方面的技术交底，并提出具体要求；

②严格执行了井控工作管理制度，落实溢流监测岗位、关井操作岗位和钻井队干部 24h 值班制度，井控准备工作已验收合格；

③各种井控装备及其他专用工具、消防器材、防爆电路系统配备齐全、运转正常；

④每次起钻前都活动方钻杆，上、下旋塞一次，以保证其正常可靠；

⑤已严格控制起下钻速度，起钻已按规定灌满钻井液；

⑥加强井场设备的运行、保养和检查，保证设备的正常运行，设备检修已按有关规定执行。

(3) 防井喷装置

在钻井作业中，安装了防井喷装置，有效预防了作业过程中突发事故引起的井喷事故，具体措施如下：

①以半封和全封防喷器为主体的防喷装置，包括高压闸门、自封、四通、套管头、过渡法兰等；

②具有净化、加大密度、原料储备及自动调配、自动灌装等功能的压井液储

备系统；

③防止井喷失控的专用设备、设施，包括高压自封、不压井起下管柱装置等。

2) 柴油泄漏风险防范措施

(1) 加强了油罐的维护保养，避免了柴油泄漏事件的发生；

(2) 在油罐底部铺设了防渗膜，实际施工未发生油品泄漏。

3、突发环境风险应急预案调查

(1) 应急预案调查

本项目钻井队为中石化胜利石油工程有限公司渤海钻井总公司，试油施工队为中石化胜利石油工程有限公司井下作业公司，均按照环境影响评价报告表及周围环境实际情况，分别制定了《中石化胜利石油工程有限公司渤海钻井总公司突发事件应急预案》《中石化胜利石油工程有限公司井下作业公司突发事件应急预案》。

根据调查与资料核实，施工单位制定的应急预案比较完善，主要内容包括以下几个方面：风险因素识别与评价；建立完善的应急组织机构，明确其组成及各岗位职责；预防与预警；给出应急报告相应程序，并根据钻井特点和风险源特性制定各专项事故应急预案及现场处置程序；配备了必要的应急设备，明确内部应急资源保障（包括应急设施及器材、应急通讯联络方式等）和外部应急通讯联络方式等。

根据应急预案的要求，本项目井场内存放相应应急物资和设备，并按照应急演练计划的要求，中石化胜利石油工程有限公司渤海钻井总公司、中石化胜利石油工程有限公司井下作业公司对发生突发环境事件定期进行演练，并做了相应记录。

(2) 应急物资调查

根据建设单位提供的资料，钻井期及试油期配备了以下物资与设备：

1) 主要物资与设备

①消防器材：灭火器、消防桶、消防钩、消防水枪等；

②主要物资：围油栏、吸油毡、铲子、草袋、排污泵、管线、铁丝、绳索、转移车辆、各类储存设施等；

③气防器具：便携式 H₂S 监测仪、正压式空气呼吸器、充气泵、防爆排风扇

等。

2) 贮存地点：井场消防板房内。

4、防范措施与应急预案落实情况调查

根据资料查阅和现场调查，本工程在钻井期制定了较为完善的环境风险防范措施与应急预案，基本落实了国家、地方有关规定，配备了必要的应急设施，设置了完善的环境风险事故防范与应急管理机构，较好的落实了环境影响报告表及批复等有关要求，定期进行了宣传和演练，加强信息交流，建立并完善了应急通信系统，确保应急通信畅通，有效的防止了各种环境风险的发生。施工期间未发生井喷、火灾或爆炸等突发环境风险事故，以及大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件。

根据调查，预案从环境风险事故的预防和应急准备、发生或可能发生事故时的报告和信息管理机制、应急救援预案的实施程序、应急救援的保障措施等方面都作了详细的规定。各部门依据应急预案，结合各自的管理职责和工作实际，落实各类事故的应急救援措施，与相关方及时进行了沟通和通报，确保在发生事故时能有序地做到各司其职，从而最大限度的控制和减少事故带来的环境污染。



图 4-3 项目应急演练照片

5、清洁生产

- 1) 钻井采用水基泥浆，广泛应用于油田开发。
- 2) 在钻井时，井口安装井控装置，最大限度的避免井喷事故的发生。

表 5 环境影响调查和监测

环境影响调查和监测

本项目为油藏勘探井钻试工程，只有施工期，不涉及运营期。其中，施工期分为钻井期和试油期。

1、生态影响调查

经现场调查，验收调查范围内生态环境总体特征为人工化程度高，生态系统类型主要为湿地生态系统、城镇生态系。

本项目完钻的义深斜 13 井具有油气开采价值，已移交开发单位。项目依托现有井场进行建设，未新增临时及永久占地。根据实际调查，施工期井场地面采用机械碾压方式进行了硬化，物料均采用袋装或桶装形式，并存放在移动板房内，减少了水土流失。

另外，本项目钻井过程中对项目周边野生动物造成了短时间的干扰。但因钻井过程时间较短，且随着钻井工程的结束，该干扰也随之消失，未对区域野生动物产生不利影响。

经调查，本工程基本落实了环评及批复中提出的各项生态环境保护措施，施工活动未对生态环境造成不利影响。

2、土壤环境影响调查

1) 污染源调查

本项目对土壤环境影响主要体现在：施工期土地平整过程改变土体结构、降低土壤养分、影响土壤理化性质等，以及钻井废弃泥浆含酸碱药剂，若处理不当，泄漏进入农田或地表水环境，影响农作物生长及地表水水质。

（1）经调查，本项目采用“泥浆不落地”工艺，钻井过程中使用了水基泥浆，钻井固废主要包括钻井过程中无法利用或钻井完工后的废弃泥浆和岩屑，收集的废弃泥浆和岩屑拉运至胜利油田东兴石油工程有限责任公司进行处理。

（2）井下作业废液及压裂返排液拉运至埕东废液站进行处理后进入采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层，无外排。试油期试油队采用船型围堰，避免了试油时对土壤和地表水造成污染。

(3) 加强培训，规范操作规程；采用视频监控及员工巡检两方面的措施，避免事故的发生。

2) 土壤环境监测

本次验收调查期间，对井场内外土壤进行了检测，检测内容如下：

(1) 监测点布设

在项目井场内及井场外 30m 处各选取 1 个监测点。

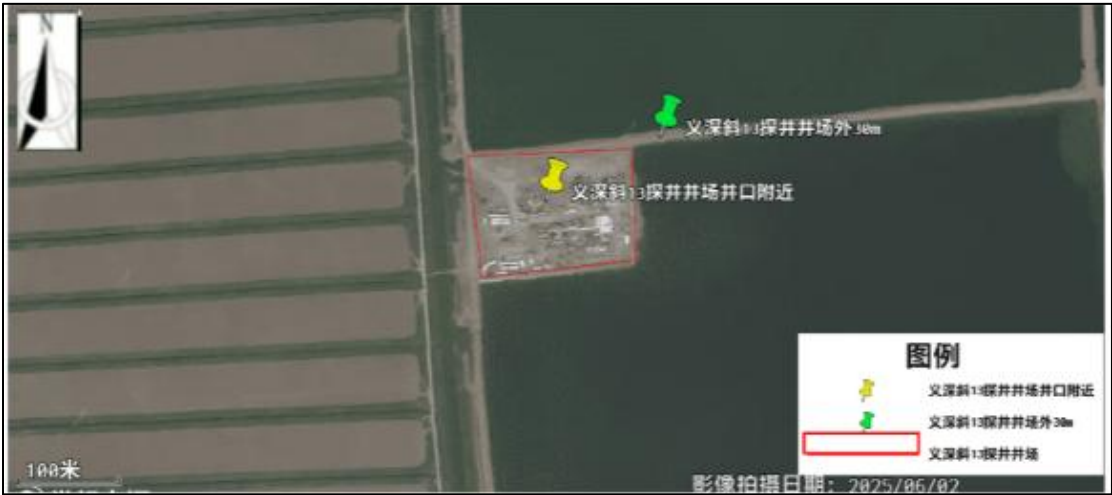


图 5-1 项目监测点位图

(2) 监测项目+

pH 值、石油烃（C₁₀-C₄₀）共 2 项。

(3) 监测时间及频次

山东胜丰检测科技有限公司于 2026 年 5 月 25 日对项目场地内、外的土壤污染情况进行采样监测，监测频次，1 次/天，监测 1 天。

(4) 采样和分析方法

采样及分析方法执行按照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）和《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）的有关规定执行。

表 5-1 项目监测技术规范、依据一览表

分析项目	分析方法	方法依据	检出限
pH	电位法	HJ 962-2018	范围 2-12
石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	气相色谱法	HJ 1021-2019	6mg/kg

表 5-2 项目检测设备一览表

仪器名称	型号	编号
气相色谱仪	7820A	SJ115

微机型 pH/mV 计	PHS-3CW	SJ23
分析天平	UW420H	SJ10
分析天平	MXX-612	SJ11

（5）质控措施

为了确保本次土壤监测数据具有代表性、可靠性和准确性，在监测过程中对全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理各环节进行严格质量控制。具体要求如下：

①设备校正和清洗

采样钻探前以及不同的监测点钻探采样间，对钻探设备和采样工具都进行了清洗，以防止交叉污染。

②样品采集

在土壤采集过程中使用一次性丁腈手套，防止样品交叉污染。

③质控样品

现场工作期间，为确保样品采集、运输、贮存过程都在质控之下，在现场采样过程中采集了现场质量控制样品。

④实验室质控

为了保证分析样品的准确性，除仪器按照规定定期校正外，在进行样品分析时还对各环节进行质量控制，包括实验室平行样、空白样、加标空白样等，随时检查和发现分析测试数据是否受控。

（6）监测结果和评价结果

土壤环境影响检测结果见表 5-3。

表 5-3 井场土壤环境质量监测结果及评价结果表

序号	指标	单位	农用地土壤污染风险筛选值	建设用地土壤污染风险筛选值	义深斜 13 井场井口附近 (0-0.5m)	义深斜 13 井场外 30m (0-0.5m)	达标性
1	pH	无量纲	$6.5 < \text{pH} \leq 7.5$	/	7.22	7.29	/
2	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	井场外：826 (参考建设用地土壤污染风险筛选值第一类用地)	井口附近：4500 (第二类用地)	46	22	达标

从上表可以看出，井场内土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤

污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表 2 建设用地土壤污染风险管控值（其他项目）中第二类用地的筛选值，井场外土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表 2 建设用地土壤污染风险管控值（其他项目）中第一类用地的筛选值。可见，本项目井场内外石油烃（C₁₀-C₄₀）监测结果变化不大，说明义深斜 13 井在钻井和试油过程中对周围土壤环境的影响较小。

3、大气污染防治效果

施工期废气主要是井场平整和车辆运输等过程产生的扬尘，各类燃油动力机械作业时产生的燃油废气，以及试油作业井场无组织挥发的轻烃。经调查，施工单位在施工过程采取了占地压实平整、施工作业场地洒水降尘、物料遮盖且四周修建围护设施；施工单位制定了《设备管理制度》，加强柴油机等非道路移动机械设备和施工车辆的管理和维修保养，并使用优质燃料，添加助燃剂等措施；试油期通过临时储油罐收集返排液，储油罐采用浸没式装车，装卸车时严格控制液体流速，控制无组织挥发废气；施工单位制定了《设备管理制度》，加强柴油机等非道路移动机械设备和施工车辆的管理和维修保养，并使用优质燃料，添加助燃剂等措施；废气污染物未对大气环境造成不利影响，且其对环境产生的影响随着施工结束已消失。

4、水环境影响

经调查，本项目钻井过程、试油期产生的废水均得到了妥善处置，没有直接外排，未对周边地表水环境和地下水环境造成不利影响；且随着钻井过程和试油期的结束将不再产生废水，不会再对周边水环境产生影响。

5、声环境影响

本项目施工期井场设备布局合理，选用了低噪声设备，整体设备安放稳固，柴油发电机安装消声器，各类机泵安装了减震基座，加强施工管理和设备维护，保证设备正常运转，高噪声设备分开施工，加强了对运输车辆的管理及疏导，车辆行驶速度小于 5km/h，停车时立即熄火，压缩施工区汽车数量和行车密度，并控制汽车鸣笛。施工噪声未对周围声环境产生不利影响，且随施工期结束已随即消失。

6、固体废物处置效果

经调查，本项目钻井期产生的钻井固废通过采用“泥浆不落地”工艺进行减量化处理，钻井固废拉运至胜利油田东兴石油工程有限责任公司进行处理。山东恒利检测技术有限公司对义深斜 13 井固化泥浆进行了检测（报告编号：SDHL 检字（2025）HJ2782），检测结果见表 5-4。

表 5-4 固化泥浆检测结果

序号	指标	单位	标准值	固化泥浆检测结果
1	pH	无量纲	6~9	7.3
2	COD _{Cr}	mg/L	≤100	40
3	石油类	mg/L	≤5	0.27
4	六价铬	mg/L	≤0.5	0.004L
5	铅	μg/L	≤1.0	0.15
6	汞	mg/L	≤0.5	0.02×10 ⁻³ L

注：L 表示未检出

根据检测结果可知，固化泥浆为第 I 类一般工业固体废物，监测指标均能够满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中表 1 和表 4 中一级标准排放要求。

本项目钻井期生活垃圾由胜利油田万和石油工程技术有限责任公司进行清运、处理；试油期生活垃圾收集至中心垃圾点统一回收。

根据现场调查，项目施工期产生的固体废弃物得到了有效处置，落实了项目环评报告表提出的相关污染防治措施。

6、主要污染物排放总量核算

本项目不涉及总量控制指标。

7、排污许可证和执行情况

本项目不需要申领排污许可证。

表 6 环评及环评审批决定的落实

环评及生态环境主管部门的审批决定的落实情况：

建设单位已经落实了环境影响报告表中对项目提出的环境保护措施，有效的降低了项目对环境的不利影响，落实情况见表 6-1。

表 6-1 环评提出的环保措施落实情况一览表

内容要素	环评要求		验收情况
	环境保护措施	验收要求	环境保护措施
陆生生态	合理制定施工计划，严格施工现场管理，减少对生态环境的扰动；制定合理、可行的生态恢复计划，并按计划落实；井场地面采用机械碾压方式进行硬化，减少水土流失；井场临时占地在施工结束后及时进行地貌恢复	严格限制施工作业范围，禁止破坏施工作业外的地表植被。临时占地上的设施搬迁后，拆除基础，恢复到原状态	①项目依托现有井场进行建设，未新增临时及永久占地；施工过程中严格控制了施工作业带面积；②施工结束后对临时占地进行了平整，项目占地范围外未发现植被破坏和车辆乱碾乱压状况、井场四周不存在超挖现象、施工现场未发现乱堆、乱放现象
水生生态	施工区域周边主要为养殖池分布，不得随意取土；钻井施工过程做好防渗工作，加强施工管理，严格控制施工作业区；禁止对周边养殖池排放污染物，禁止在周边养殖池存放油品，禁止在周边养殖池的附近给车辆、设备加油；施工过程中注意对施工机具的维护，防止其漏油，机械设备若有漏油现象要及时处理，避免造成大的污染	/	施工期严格划定了施工作业范围，未随意取土；钻井施工过程做好了防渗工作，加强了施工管理，严格控制了施工作业区；施工期间产生的废水、固废等污染物均已进行合理处置，未外排入周边养殖池；施工期油品远离周边养殖池进行存放，并采取了防渗措施，加强了防渗；车辆、设备加油均远离养殖池进行操作；施工过程中加强了对施工机具的维护，未发生漏油现象
地下水及土壤环境	井下作业废液、压裂返排液由罐车拉运至河口采油厂渤三联合站采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注	井下作业废液、压裂返排液处理后执行《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标；生活污水不外排	①井下作业废液、压裂返排液由罐车拉运至河口采油厂埕东废液站进行处理后进入采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层，无外排；②生活污水排至环保厕所，定期清运处理

	地层，无外排；生活污水排至环保厕所，由环保厕所供应单位定期回收处置		
声环境	本项目在施工期合理布局钻井现场，尽量选用低噪声设备；制定施工计划时，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。合理安排施工工序，高噪声设备施工时间尽量安排在昼间；加强施工管理和设备维护，发现设备存在的问题及时维修，保证设备正常运转；整体设备要安放稳固，并与地面保持良好接触，安装消音隔音设施，高噪声设备加装减振支垫，最大限度地降低噪声源的噪声；加强对运输车辆的管理及疏导，尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛	严格落实噪声措施，施工期无噪声扰民环保投诉；执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。	本项目在施工期合理布局钻井现场，选用低噪声设备；制定施工计划时，避免了大量高噪声设备同时施工。高噪声设备施工时间安排在昼间；加强施工管理和设备维护，保证设备正常运转；整体设备安放稳固，并与地面保持良好接触，安装消音隔音设施，高噪声设备加装减振支垫，最大限度地降低噪声源的噪声；加强对运输车辆的管理及疏导，压缩施工区汽车数量和行车密度，进场禁止汽车鸣笛，满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）限值要求，施工期间未收到居民投诉
大气环境	施工现场和道路采取洒水措施、施工现场周围采取围挡措施、物料集中堆放并采取遮盖等措施；使用合格油品；加强施工管理，尽可能缩短施工周期；保证设施正常运行，加强管理，减少非甲烷总烃的挥发	满足《山东省扬尘污染防治管理办法》（2018年1月24日）、《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》（鲁环发[2019]112号）、《东营市工业企业堆场扬尘治理技术导则（试行）》（2018年9月）的相关要求，无固定、长期污染源，区域环境功能未发生改变。	①加强了施工期环境管理，按照《山东省扬尘污染防治管理办法》（2018年1月24日）要求，严格控制了施工扬尘污染；②对施工现场采取了洒水、围挡、遮盖等控制措施来减少施工扬尘影响；非道路移动机械使用了优质燃油，加强了设备和运输车辆的检修和维护，控制了车辆装载量、采取了遮盖措施，减小了机械设备与车辆运输产生废气对周围的影响，能够满足《关于印发山东省扬尘污染综合整治方案的通知》（鲁环发[2019]112号）、《东营市工业企业堆场扬尘治理技术导则（试行）》（2018年9月）的相关要求；③试油期通过临时储油罐收集返排液，储油罐采用浸没式装车，装卸车时严格控制液体流速，控制无组织挥发废气；施工单位制定了《设备管理制度》，加强柴油机等非道路移动机械设备和施工车辆的管理和维修保养，并使用优质燃

			料, 添加助燃剂等措施
固体废物	①钻井固废采用“泥浆不落地”工艺, 减少固废产生量, 全部交由专业单位无害化处理; ②施工期在重点防渗区铺设渗透系数$\leq 10^{-10}\text{cm/s}$的防渗材料, 防渗材料循环利用, 使用过程中如产生不可利用的废防渗材料, 需委托有危险废物处理资质单位处置, 废防渗材料为危险废物; 设备保养产生的危废(废润滑油、废润滑油桶、废弃的含油抹布、劳保用品)在井场危废贮存点内暂存, 统一委托有危险废物处置资质的单位处理; ③生活垃圾暂存于施工场地临时设置的垃圾桶内, 由施工单位拉运至生活垃圾中转站后, 由当地环卫部门统一处理	一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020); 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)中相关要求	①钻井过程采用“泥浆不落地”工艺, 钻井固废委托胜利油田东兴石油工程有限责任公司处理; ②经调查, 本项目施工期在油罐区、配浆用水池区、泥浆不落地装置区、钻具区等重点防渗区铺设了渗透系数$\leq 10^{-10}\text{cm/s}$的防渗材料, 防渗材料循环利用, 未产生不可利用的废防渗材料; 项目启动前已完成设备的基本维护, 施工期间未产生废润滑油、废润滑油桶, 废弃的含油抹布、废弃劳保用品; ③钻井期生活垃圾由胜利油田万和石油工程技术有限责任公司进行清运、处理; 试油期生活垃圾收集至中心垃圾点统一回收
环境风险	严格执行国家的环保标准规范及相关的法律法规。制定环保生产方针、政策、计划和各种规范, 完善安全管理制度和安全操作规程, 建立健全环境管理体系和监测体系, 完善各种规章、制度和标准。对施工单位及人员定期进行环保、安全教育, 增强职工的环保意识和安全意识。在施工、选材等环节严守质量关, 加强技术工人的培训, 提高操作水平。研究各种事故, 总结经验, 充分吸取教训, 并注意在技术措施上的改进和防范, 尽可能减少人为的繁琐操作过程	避免、预防环境风险事故的发生或减轻风险事故的影响。	严格执行了国家的环保标准规范及相关的法律法规。施工单位制定了应急预案并配备必要的应急物资, 定期组织人员进行了演练, 加强了施工人员的环保意识; 在施工、选材等环节严守质量关, 加强了技术工人的培训, 提高了操作水平; 施工现场配备预防井喷事故的安全设备和应急物资, 并定期进行演练
环境	发生风险事故时, 需按照	发生风险事故时开展环	本项目施工过程未发生风险事故

监测	制定的环境风险应急监测计划完成环境监测	境应急监测	
----	---------------------	-------	--

生态环境主管部门的审批决定的落实情况见表 6-2。

表 6-2 生态环境主管部门的审批决定落实情况一览表

生态主管部门的审批决定		执行情况
1	该项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，进行竣工环境保护验收，经验收合格后方可投入正式生产	经现场核查，本项目严格执行了环保“三同时”制度，基本建立了环境管理体系，落实了环评报告表及其批复文件中提出的相关要求，各项污染防治措施、生态保护措施和环境风险防范措施有效可行，未对周围环境产生明显不利影响。本次验收调查期间，工程占地的生态恢复情况良好，土壤环境质量能够满足相关标准要求，各项污染物均能达标排放，符合竣工环境保护验收条件
2	该项目的环境影响报告表经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动，你公司应当重新报批建设项目的环评文件	经调查，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等未发生重大变动
3	该项目涉及的经济综合管理、规划、建设、土地等其他事项，你单位应遵照有关部门要求执行	项目涉及的经济综合管理、规划、建设、土地等其他事项，均已遵照有关部门要求执行

表 7 验收调查结论

验收调查结论及建议

1、工程调查结论

义深斜 13 井建设位置位于山东省滨州市海防办事处东五村西北 3.45km。本项目新钻义深斜 13 井 1 口，实际钻深 4932m，完钻后进行试油，试油后发现该井具有开采价值，项目施工完成，已移交开发单位。项目实际总投资 2470 万元，其中环保投资 135 万元。本项目于 2025 年 3 月 8 日开工建设，2026 年 4 月 28 日试油完成。施工期间，环境保护设施运行正常。

经与环评阶段对比实际开发方式、生产工艺与环评保持一致。因地下油藏具有隐蔽性，实际根据含油储层位置、厚度、工程施工难度等调整了钻井进尺，井深减少 101.11m；项目总投资减少 47 万元，环保投资减少 7.4 万元；井下作业废液、压裂返排液处置地点由渤三联合站调整为埕东联合站，处置地点发生变化，但处理效果未变，均回注地层，未外排，能够满足环评及批复的相关要求；项目启动前已完成设备的基本维护，施工期间未产生废润滑油、废润滑油桶，废弃的含油抹布、废弃劳保用品。

根据《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910 号）中相关规定，本项目变动不属于重大变动。

2、工程建设对环境影响

1) 生态环境影响

本项目依托现有井场进行建设，实际项目施工未新增临时及永久占地。根据现场调查，目前该井已移交开发单位，施工场地已进行了压实平整，效果良好，未造成环境污染，对动物的影响也随着施工期的结束而逐渐消除。项目已经落实了环境影响报告表所提出的生态保护要求，总体影响较小。

2) 大气环境影响

施工期废气主要是井场平整和车辆运输等过程产生的扬尘，各类燃油动力机械作业时产生的燃油废气，以及试油作业井场无组织挥发的轻烃。经调查，施工单位在钻井过程和试油期采取了占地压实平整、施工作业场地洒水降尘；试油期通过临时储油罐收集返排液，储油罐采用浸没式装车，装卸车时严格控制液体流

速，控制无组织挥发废气；施工单位制定了《设备管理制度》，加强柴油机等非道路移动机械设备和施工车辆的管理和维修保养，并使用优质燃料，添加助燃剂等措施；废气污染物对大气环境造成影响较小，且其对环境产生的影响随着施工结束已消失。

3) 水环境影响

项目井下作业废液及压裂返排液拉运至埕东废液处理站进行处理后进入采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层，无外排；施工现场设置了环保厕所，生活污水全部排入环保厕所，定期清运，未直接外排区域环境。因此，项目未对地表水环境产生不利影响。

4) 声环境影响

经现场调查，项目 200m 范围内无声环境敏感目标。本项目施工期选用了低噪声设备，整体设备安放稳固，柴油发电机安装消声器，各类机泵安装了减振基座，加强施工管理和设备维护，保证设备正常运转，制定了合理的施工计划，高噪声设备分开施工，加强了对运输车辆的管理及疏导，车辆行驶速度小于 5km/h，停车时立即熄火，压缩施工区汽车数量和行车密度，并控制汽车鸣笛。

5) 固体废物环境影响

经调查，本项目钻井过程采用“泥浆不落地”工艺，钻井固废委托胜利油田东兴石油工程有限责任公司进行处置。项目钻井期生活垃圾由胜利油田万和石油工程技术有限责任公司进行清运、处理；试油期生活垃圾收集至中心垃圾点统一回收。各种固体废物均得到了妥善处理，未在地表遗留，未对周围环境产生不良影响。

6) 土壤环境影响

根据检测结果，井场内土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表 2 建设用地土壤污染风险管制值（其他项目）中第二类用地的筛选值，井场外石油烃（C₁₀-C₄₀）土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表 2 建设用地土壤污染风险管制值（其他项目）中第一类用地的筛选值。因此本项目施工期对所在地土壤环境影响较小。

7) 环境风险防范与应急措施调查

针对施工期存在的各种风险事故，施工队在工艺设计、设备选型、施工监督管理等各环节都采取了有效的防范措施，制定了各类事故应急预案。

从现场调查的情况看，项目钻井过程中未发生井喷等风险事故，说明建设单位采取的环境风险防范措施是较为有效的。

3、建议和后续要求

1) 加强井场的应急防范与监控。

2) 加强环境管理工作，继续健全和完善各类环保规章制度、HSE 管理体系。

4、验收总结论

经现场核查，本项目严格执行了环保“三同时”制度，建立了环境管理体系，落实了环评报告表及其批复文件中提出的相关要求，各项污染防治措施、生态保护措施和环境风险防范措施有效可行，未对周围环境产生明显不利影响。本次验收调查期间，工程占地的生态恢复情况良好，土壤环境质量能够满足相关标准要求，各项污染物均能达标排放，符合竣工环境保护验收条件。因此，建议本工程通过竣工环境保护验收。

附件 1 委托书

建设项目竣工环境保护验收委托书

山东胜丰检测科技有限公司：

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心
义深斜 13 探井已具备竣工环境保护验收调查条件。根据国家环境保护条例的规定，特委托你单位承担本项目的竣工环境保护验收调查工作。请接受委托后尽快组织相关人员进行现场环境验收调查工作，并编制本项目的竣工环境保护验收调查表。在验收调查过程中，我单位对向委托单位提供的一切资料、数据和实物的真实性负责。

中国石油化工股份有限公司
胜利油田分公司油气勘探管理中心
(盖章有效)

2026 年 4 月 29 日

附件 2 环评批复

滨审批四表〔2024〕380500019 号

审批意见:

你公司关于《中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心义深斜 13 井环境影响报告表》收悉。根据评价结论和专家审查意见,并经局长办公会研究通过,批复如下:

根据森诺科技有限公司对该项目开展环境影响评价的结论、专家评审意见和复审意见,在全面落实报告表提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下,工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的环境保护措施。

一、在项目建设与生产管理中,你公司应认真对照并落实报告表提出的各项环保对策措施。

二、该项目必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后,进行竣工环境保护验收,经验收合格后方可投入正式生产。

三、该项目的环境影响报告表经批准后,如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动,你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、该项目涉及的经济综合管理、规划、建设、土地等其他事项,你单位应遵照有关部门要求执行。



附件3 竣工公示



中国石化胜利油田

SINOPEC SHENGLI OILFIELD

首页

中国石化网站群

官方微博

中国石化

关于我们

新闻动态

业务介绍

信息公开

人力资源

科技创新

美丽油田

网上信访

社会责任



首页 >> 社会责任 >> 环境保护信息公开

义深斜13探井竣工日期公示

义深斜13探井竣工日期公示

根据《建设项目环境保护验收暂行办法》（2017年11月20日）等相关规定，现将环境保护竣工日期进行公示：

项目名称：义深斜13探井

建设地点：山东省滨州市海防办事处东五村西北3.45km

主要建设内容：新钻义深斜13井1口，实际钻深4932m。

竣工日期：2026年4月28日。

联系人：赵工

联系电话：0546-6378057

联系地址：东营市东营区胜建大厦

2026年4月28日

信息来源：

305C-04-28

© 中国石化胜利油田版权所有2013-2014 京ICP备 09037230 号

联系我们

统一社会信用代码		营业执照		扫描二维码，了解更多市场主体信息，可登录国家企业信用信息公示系统查询。	
91370500164841180P		(副本) 1-1			
名称	胜利油田东兴石油工程有限责任公司	注册资本	壹仟万元整		
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	1991 年 12 月 16 日		
法定代表人	荆伟	住所	东营市河口区海盛路55号		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，网络技术服务，信息技术咨询服务，环保咨询服务，信息系统运行维护服务，信息系统集成服务，软件开发，网络与信息安全软件开发，水污染治理，固体废物治理，土壤污染治理与修复服务，水环境污染防治服务，金属结构制造，建筑砌块制造，石油钻采专用设备销售，环境保护专用设备销售，办公设备销售，办公设备耗材销售，网络设备销售，软件销售，建筑砌块销售，机械设备租赁，小微型客车租赁经营服务，非居住房地产租赁，物业管理，劳务服务（不含劳务派遣），土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工，建筑劳务分包，污水处理及其再生利用，道路货物运输（不含危险货物），道路旅客运输经营，劳务派遣服务，餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）				
		登记机关	胜利油田东兴石油工程有限责任公司 2024 年 01 月 18 日		

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

57

附件 5 钻井泥浆转运联单（部分）

钻井（侧钻井）岩屑及钻井液综合治理转运联单											
联单编号: 0115											
产生单位(队号)		50691		施工井号		义深斜13井		工 况		清罐	
类 型		☐ 岩屑 ☒ 钻井液		施工类型		☒ 集中处置工艺		产生单位签章			
		☐ 泥饼				☐ 随钻随治工艺					
数 量 (方)		30.15		装车时间		2025 年 5 月 30 日 12:24					
运输单位		峡湾物流		运输车型		罐车		运输单位签章			
拉运起止地点		井场至东兴环保站		车牌号		鲁E70289		18678643831		第一联产生单位留存	
治理单位		东兴环保站		数量(方)		30.15		治理单位签章			
接收重量(吨)		皮重 20.48		毛重 61.66		净重 41.18					
接收时间		2025 年 5 月 30 日 13:59									
备注		1. 联单编号编写方式: 每口井第一本编号为 0001, 然后编号按车辆拉运顺序续编。 2. 此联单每份限一车使用, 留存期三年。 3. 交接时此联单各项目及签章填写齐全, 准确, 填写方量和吨数精确到小数点后两位。 4. 此联单一式五联, 产生单位、甲方环保部门、二线单位环保部门、治理单位、运输单位各一联。									

附件 6 井下作业废液及压裂返排液转运联单（部分）

第二联
施工单位留存

河口采油厂固废废液转运联单

编号: 0030428

产生单位	管理四区	施工地点	义海斜13	运输时间	2025年9月7日 14时00分
施工单位	试油作业10队	施工目的	洗井	运输时限	2 小时
装车前 PH 值	7	车辆罐内检查	合格	数量 (方)	11.29
种类	钻(侧)井废弃泥浆 ☐ 采出液沉积物 ☐ 酸化、酸洗返排液 ☐ 压裂返排液 ☐ 修井作业施工废水 ☐ 油水井日常维护废水 ☐ 设备设施泄漏废水 ☐ 化验产生废液 ☐ 采出水 ☐ 压滤液 ☐				
运输单位	通海运输	车号	冀E12302 (大通)	驾驶员(本人签名)	李振德
样品是否留存	是/否	卸车前 PH 值	7	驾驶员手机号码	13022612225
联单开具人员签名: 王五平 手机号: 1867869 5878			接收确认信息符合性, 符合画√ PH值 ☐ 种类 ☐ 数量 ☐ 运输单位 ☐ 车号 ☐ 现场视频完好 ☐		
联单开具单位(专用章): 2025年9月7日			接收人员签名: 魏子乙 2025年9月7日 15时35分		

说明: 1. 开具人负责填写产生单位、施工单位、运输时间、运输时限、PH值、数量、废液种类、运输单位、车号等, 并签字加盖专用章。
2. 废液运输单位驾驶员必须本人签字确认。接收人负责确认接收信息, 并签名。
3. 联单由开发单位、施工单位、运输单位、接收单位分别留存。

李同东
13157249528

第二联
施工单位留存

河口采油厂固废废液转运联单

编号: 0030442

产生单位	管理四区	施工地点	义海斜13	运输时间	2025年9月9日 17时30分
施工单位	试油作业10队	施工目的	洗井	运输时限	2 小时
装车前 PH 值	7	车辆罐内检查	合格	数量 (方)	9.32
种类	钻(侧)井废弃泥浆 ☐ 采出液沉积物 ☐ 酸化、酸洗返排液 ☐ 压裂返排液 ☐ 修井作业施工废水 ☐ 油水井日常维护废水 ☐ 设备设施泄漏废水 ☐ 化验产生废液 ☐ 采出水 ☐ 压滤液 ☐				
运输单位	通海	车号	冀E12322	驾驶员(本人签名)	王五平
样品是否留存	是/否	卸车前 PH 值	7	驾驶员手机号码	13157249528
联单开具人员签名: 王五平 手机号: 1867869 5878			接收确认信息符合性, 符合画√ PH值 ☐ 种类 ☐ 数量 ☐ 运输单位 ☐ 车号 ☐ 现场视频完好 ☐		
联单开具单位(专用章): 2025年9月9日			接收人员签名: 魏子乙 2025年9月9日 18时40分		

说明: 1. 开具人负责填写产生单位、施工单位、运输时间、运输时限、PH值、数量、废液种类、运输单位、车号等, 并签字加盖专用章。
2. 废液运输单位驾驶员必须本人签字确认。接收人负责确认接收信息, 并签名。
3. 联单由开发单位、施工单位、运输单位、接收单位分别留存。

王五平
13280357662

附件 7 验收检测报告



正本

检测报告

胜丰环检字（2026）第 Y061 号



SFJP-YHJ2026-061

委托单位

中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司

油气勘探管理中心

样品名称

土壤

山东胜丰检测科技有限公司

2026 年 05 月 29 日







检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 221521343510

名称: 山东胜丰检测科技有限公司

地址: 东营区蒙山路7号(257000)

经审查,你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力,现予批准,可以向社会出具具有证明作用的数据和结果,特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。



许可使用标志



发证日期:

有效期至: 2022年10月25日

发证机关: 2028年10月24日

山东省市场监督管理局

221521343510

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制,在中华人民共和国境内有效。

检测报告

胜丰环检字（2026）第 Y061 号

样品名称	土壤		
委托单位	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心		
项目名称	义深斜 13 探井		
联系人、电话	宋金龙 19806039800		
检测地点	山东省滨州市海防办事处东五村西北 3.45km		
检测类别	委托检测	检测目的	—
样品状态	瓶装固体	包装情况	包装完好、无破损
采样日期	2026.05.25	检测日期	2026.05.26-2026.05.27
检测项目	pH 值、石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）		
检测设备	仪器名称	型号	编号
	气相色谱仪	7820A	SJ115
	微机型 pH/mV 计	PHS-3CW	SJ23
	分析天平	UW420H	SJ10
	分析天平	MXX-612	SJ11
备注	土壤监测点位坐标： 义深斜 13 探井井场井口（0-0.5m）：E118.57129°N37.90754°； 义深斜 13 探井井场外 30m（0-0.5m）：E118.55228°N37.95173°。		
(本表以下空白)			

编写人：刘新建 审核人：张松 签发人：刘美丽

2026 年 05 月 29 日

检测报告

胜丰环检字（2026）第 Y061 号

一、土壤

（一）监测技术规范、依据

分析项目	分析方法	方法依据	检出限
pH	电位法	HJ 962-2018	范围 2-12
石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	气相色谱法	HJ 1021-2019	6mg/kg

（二）检测结果

检测项目	单位	义深斜 13 探井井场井口附近（0-0.5m）	义深斜 13 探井井场外 30m（0-0.5m）
		YHJ2606101#A0001	YHJ2606102#A0001
pH	无量纲	7.22	7.29
石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/kg	46	22

（三）检测点位示意图

检测点位示意图：



*****报告结束*****

说 明

- 一、本检测报告仅对本次委托项目负责。
- 二、检测工作依据有关法规、协议和技术文件进行。
- 三、未经本公司书面批准，不得复制本检测报告。
- 四、本检测报告如有涂改、增减无效，未加盖单位印章、骑缝章无效。
- 五、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 六、委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出复核申请，逾期不予受理。
- 七、未经本公司书面批准，本检测报告及我公司名称，不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 八、加盖 CMA 章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖 CMA 章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明作用。

通讯地址：东营市东营区蒙山路 7 号

邮 编：257000

电 话：13589452559

附件 8 验收检测现场照片



附件 9 其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中如实记载了本项目的环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施的落实情况，以及整改工作情况等。中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心（以下简称“勘探管理中心”）需要说明的具体内容如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

勘探管理中心义深斜 13 探井项目将环境保护措施纳入了初步设计，主要包括：施工过程中对生态环境的保护，施工结束后对临时占地进行平整恢复，施工期产生的废水、废气、噪声、固废的收集、处置等。项目环境保护措施的设计符合环境保护设计规范要求，在初步设计文件中编制了环境保护篇章，落实了防止污染和生态破坏措施及环境保护设施投资概算：环评设计总投资 2517 万元；环保投资 142.4 万元。

1.2 施工简况

建设单位勘探管理中心与施工单位中石化胜利石油工程有限公司渤海钻井总公司根据相关环境保护法律法规的要求，签订了施工合同，在施工合同中对环境影响报告及其审批意见中提出的生态环境保护措施和污染防治措施提出了明确要求。在施工过程中，建设单位严格按照施工合同的要求，保障了环境保护设施的资金需要；施工单位严格按照合同中的要求，保障了环境保护设施的施工进度，符合《中华人民共和国环境保护法》中的相关要求。

1.3 验收过程简况

1、2024 年 10 月，森诺科技有限公司编制完成了《义深斜 13 探井项目环境影响报告表》；

2、2024 年 11 月 1 日，滨州市行政审批服务局对《义深斜 13 探井项目环境影响报告表》进行了批复，批复文号为“滨审批四表[2024]380500019 号”（见附件 2）；

3、2025 年 3 月 8 日，项目开始施工；2025 年 8 月 27 日，项目完钻；

4、2025 年 8 月，项目开始试油作业；2026 年 4 月 28 日，试油结束，试油

结果表明义深斜 13 探井具有开采价值，项目竣工，已移交开发单位；

5、2026 年 4 月 28 日，中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心（以下简称“勘探管理中心”）对该项目竣工日期在中国石化胜利油田网站（<http://slof.sinopec.com>）进行了公示（见附件 3）；

6、2026 年 4 月 29 日，勘探管理中心委托山东胜丰检测科技有限公司（以下简称“我公司”）进行该项目的竣工环保验收调查工作（见附件 1）；

7、2026 年 5 月 8 日，我公司进行验收现场调查，调查期间义深斜 13 探井已移交开发单位，探井钻井期、试油期污染物已得到有效处置，临时占地已进行了平整恢复，未造成环境污染；

8、2026 年 5 月 25 日，我公司对项目场地的土壤污染情况进行了采样，开展了现状监测；

9、2026 年 6 月，我公司完成了本项目竣工环境保护验收调查报告表的编制工作；

10、2026 年 6 月 12 日，勘探管理中心组织了《义深斜 13 探井竣工环境保护验收调查报告表》企业自主验收会，专家组出具了专家意见，会议通过了本项目竣工环保验收。

2 信息公开和公众意见反馈

2.1 信息公开

2026 年 4 月 28 日，勘探管理中心对该项目竣工日期在中国石化胜利油田网站（<http://slof.sinopec.com>）进行了网上公示。

2.2 公众参与渠道

建设单位通过电话接听的方式收取公众参与。

2.3 公众意见处理

本项目建设工程、验收调查期间未收到公众意见或投诉，表明公众支持该项目的建设。

3 其他环境保护措施的落实情况

3.1 制度措施落实情况

3.1.1 环境保护组织机构及规章制度

为了确保各项设施的有效运行，建设单位制定了各类设备操作规程、设备运

转记录、保养记录。操作人员根据各项制度进行设备检修和保养，通过巡查等方式及时发现该项目设施运行中出现的问题，通过公司领导由生产调度会安排解决问题，并严格督察解决的结果，以确保环保设施的正常运行。

3.1.2 环境风险防范措施

根据调查与资料核实，建设单位制定的应急预案比较完善，主要内容包括以下几个方面：风险因素识别与评价；建立完善的应急组织机构，明确其组成及各岗位职责；预防与预警；给出应急报告相应程序，并根据钻井特点和风险源特性制定各专项事故应急预案及现场处置程序；配备了必要的应急设备，明确内部应急资源保障（包括应急设施及器材、应急通讯联络方式等）和外部应急通讯联络方式等。

根据应急预案的要求，本项目井场内存放相应应急物资和设备，并按照应急演练计划的要求，中石化胜利石油工程有限公司渤海钻井总公司对发生突发环境事件定期进行演练。

3.1.3 生态环境监测和调查计划

环境影响报告表及其审批部门审批决定没有对生态环境监测、调查计划要求。

3.2 环境保护措施落实情况

3.2.1 施工期环境保护措施

1) 大气环境保护措施和对策

经验收调查可知，施工单位制定了合理化管理制度，加强管理；施工期严格控制了施工作业面积、采取了控制硬化施工道路和井场、洒水降尘、控制车辆装载量等措施，有效减少了扬尘；施工单位加强日常的运输车辆管理和维护；建立了环境管理制度，并严格执行；试油期通过临时储油罐收集返排液，储油罐采用浸没式装车，装卸车时严格控制液体流速，控制无组织挥发废气。

2) 水环境保护措施和对策

经验收调查可知，本项目井下作业废液及压裂返排液拉运至埕东废液处理站进行处理后进入采出水处理系统进行处理，处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层，无外排；生活污水排至环保厕所，定期清运，未直接外排区域环境。因此，项目未对地表水环境产生不利影响。

3) 声环境保护措施和对策

本项目施工期井场设备布局合理, 选用了低噪声设备, 整体设备安放稳固, 柴油发电机安装消声器, 各类机泵安装了减振基座, 加强施工管理和设备维护, 保证设备正常运转, 制定了合理的施工计划, 高噪声设备分开施工, 并且安排在昼间, 加强了对运输车辆的管理及疏导, 车辆行驶速度小于 5km/h, 停车时立即熄火, 压缩施工区汽车数量和行车密度, 并控制汽车鸣笛, 噪声符合《建筑施工噪声排放标准》(GB 12523-2025) 相关标准。

4) 固体废物处置

经验收调查可知, 本项目采用“泥浆不落地”工艺, 钻井过程中使用了环保型水基泥浆, 钻井固废主要包括钻井过程中无法利用或钻井完工后的废弃泥浆和岩屑, 收集的废弃泥浆和岩屑拉运至胜利油田东兴石油工程有限责任公司进行处理。本项目钻井期生活垃圾由胜利油田万和石油工程技术有限责任公司进行清运、处理; 试油期生活垃圾收集至中心垃圾点统一回收。

3.2.2 保障环境保护设施有效运行的措施

定期进行设备维护, 填写记录。

3.2.3 生态系统功能恢复措施

施工结束后, 对井场场地进行了平整压实。

3.2.4 生物多样性保护措施

- 1) 严格控制施工临时占地, 减少对地表植被的破坏;
- 2) 加快施工进度, 缩短施工期, 以减轻施工活动对区域野生动物的影响。

3.3 配套措施落实情况

3.3.1 区域削减及淘汰落后产能

本项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能。

3.3.2 防护距离控制及居民搬迁

本项目不涉及防护距离控制及居民搬迁。

3.3.3 其他措施

本项目不涉及区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

4 整改工作情况

整改意见: 1、更新编制依据;

整改说明：已对编制依据进行完善、更新，详见报告“表 1 编制依据”。

整改意见：2、完善建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表。

整改说明：已对建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表进行完善。

附件 10 验收意见

胜利油田分公司油气勘探管理中心文件

胜油勘发〔2026〕35 号

关于义深斜 13 探井竣工环境保护验收的意见

2026年6月12日，油气勘探管理中心组织验收工作组（见附件1）对《义深斜13探井竣工环境保护验收调查报告表》进行了审查，对项目现场进行了检查，出具了专家验收意见（见附件2）。相关单位针对专家提出的问题进行了整改。2026年6月29日验收工作组专家对整改情况进行了复核（见附件3）。

验收组认为：本项目环境保护手续齐全，基本落实了环评及批复文件提出的各项环保措施和要求，污染物排放满足国家及地方现行排放标准。

经研究，同意“义深斜13探井”通过竣工环境保护验收。

附件：

1. 建设项目竣工环境保护验收成员表
2. 验收工作组意见
3. 验收工作组意见复核（专家签字）

中石化胜利油田分公司油气勘探管理中心

2026 年 7 月 1 日




油气勘探管理中心综合协调室

2026 年 7 月 1 日印发

建设项目竣工环境保护验收成员表

项目名称：义深斜 13 探井

日期：2026年6月12日

验收组		姓名	单位	联系方式	签名
组长	建设单位	赵盛礼	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心	13280370089	
	建设单位	路成	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心	13255628625	
	评审专家	王志强	中石化（山东）检测评价研究有限公司	13954629951	
		白雪松	中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司河口采油厂	18678631188	
		陈 鹏	胜利油田石油开发中心有限公司	13305463315	
	验收编制单位	宋金龙	山东胜丰检测科技有限公司	19806039800	
	验收监测单位	王康磊	山东胜丰检测科技有限公司	13181977672	
	设计单位	李 斌	中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院	13963358408	
	施工单位	王新军	中石化胜利石油工程有限公司渤海钻井总公司	13864770925	
	环评单位	孙苗苗	森诺科技有限公司	0546-8775108	
	其他				

注：建设单位组织建设项目验收。

义深斜 13 探井项目竣工环境保护验收意见

2026 年 6 月 12 日，中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心（以下简称“勘探管理中心”）。根据《义深斜 13 探井项目竣工环境保护验收调查报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范和指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

义深斜 13 探井位于山东省滨州市海防办事处东五村西北 3.45km 处。本项目新钻义深斜 13 探井 1 口，实际钻深 4932m，完钻后进行试油，试油后具有开采价值，已交由开发单位纳入三同时管理。

2、建设过程及环境保护审批情况

2024 年 11 月 1 日，滨州市行政审批服务局对《义深斜 13 探井项目环境影响报告表》进行了批复，批复文号为“滨审批四表[2024]380500019 号”；

2025 年 3 月 8 日，项目开始施工；2025 年 8 月 27 日，项目完钻；

2025 年 8 月，项目开始试油作业；2026 年 4 月 28 日，试油结束，试油结果表明义深斜 13 探井具有开采价值，项目竣工，已移交开发单位。

验收期间，根据现场踏勘和资料调研，本项目从立项至竣工过程中不存在违法行为，未收到环境投诉及处罚记录等。

3、投资情况

本项目实际总投资 2470 万元，环保投资 135 万元，占实际总投资的 5.47%。

4、验收范围

本次验收范围是项目实际建设内容及其配套建设环保设施，包括项目依托工程的依托可行性。

二、工程变动情况

经与环评阶段对比，实际开发方式、生产工艺与环评保持一致。因地下油藏具有隐蔽性，实际根据含油储层位置、厚度、工程施工难度等调整了钻井进尺，井深减少 101.11m；项目总投资减少 47 万元，环保投资减少 7.4 万元；井下作业废液、压裂返排液处置地点由渤三联合站调整为埕东联合站，处置地点发生变化，但处理效果未变，均回注地层，未外排，能够满足环评及批复的相关要求；项目启动前已完成设备的基本维护，施工期间未产生废润滑油、废润滑油桶，废弃的含油抹布、废弃劳保用品。

以上变化内容均未对周围环境影响造成显著变化（特别是不利环境影响加重）。其余实际工程内容与环评中的工程内容大体一致；项目生产工艺流程等未发生变化，未新增污染物种类。参考《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函[2019]910 号），本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

1、生态保护工程和设施建设情况

1) 合理规划井位，依托现有井场进行建设，减少占地，减轻了对生态环境的影响；

2) 井场建设时，建立了环境监督制度，监督指导施工落实了生态保护措施，在工程实施过程中，严格按照国家、地方等相关环境法律法规及设计方案进行施工，做到了工序紧凑、有序，缩短工期，井场四周未出现超挖现象；

3) 本项目钻井作业过程严格控制施工作业范围，无人为破坏用地以外植被，施工单位提高施工人员对野生动物的保护意识，未发生捕杀野生动物的行为；

4) 施工井场采用了洒水降尘等措施，减少扬尘扩散；施工过程中产生的固体废物得到了妥善处置，未将废弃泥浆、生活污水等排入周边水体，未在水体内清洗钻具；

5) 施工现场未发现乱堆、乱放现象，施工结束后对施工场地进行了平整压实。

2、污染防治和处置设施建设情况

1) 废气

本项目施工期大气污染物主要包括施工扬尘和施工废气。

(1) 施工扬尘

本项目施工扬尘主要产生于：井台建设、车辆运输过程。施工单位制定了合理化管理制度，加强管理，采取了控制施工作业面积、硬化施工道路和井场、洒水降尘、控制车辆装载量等措施；四级及以上风力停止土方运输、土方开挖、土方回填以及其他可能产生扬尘污染的施工作业，施工结束后及时对施工场地进行了清理平整，有效控制了施工扬尘。

(2) 施工废气

本项目施工期间产生的施工废气主要为钻运输车辆尾气、柴油机尾气及试油期井场无组织挥发废气。

① 柴油机尾气

钻井过程中钻机等设备用电由大功率柴油发电机提供，其运转时向大气中排放了少量燃油废气，主要的污染物为总烃、NO_x、SO₂、烟尘等。经调查，钻井单位制定了《设备管理制度》，柴油机等非道路移动机械设备已备案并取得环保号码，并对这些设备加强管理和维修保养，使用优质燃料，添加助燃剂，实际对大气环境产生的影响较小。

② 运输车辆尾气

项目钻井期施工车辆在进行施工活动时产生了少量燃油废气，主要污染物为SO₂、NO_x、CmHn等。经调查，钻井单位制定了《设备管理制度》，柴油机等非道路移动机械设备已备案并取得环保号码，并对这些设备加强管理和维修保养，使用优质燃料，添加助燃剂，实际对大气环境产生的影响较小。

③ 试油期井场无组织挥发废气

试油期井场设置临时储油罐，储油罐装车以及试油过程均会有轻烃无组织挥发。经调查，试油期通过临时储油罐收集返排液，储油罐采用浸没式装车，鹤管距离罐底高度<20cm，装卸车时严格控制液体流速，在没有淹没进料管口和装卸即将结束前，液体的流速控制在1m/s以内，正常作业流速不超过4.5m/s。

高温天气(8-9 月份)上午 10 点到下午 4 点不装车。在运输过程中匀速行驶;同时加强了对驾驶员环境保护知识的宣传和培训。采取以上措施后,极大地减少了非甲烷总烃挥发量,并可防止产生静电和液体冒顶溢流,有效降低轻烃无组织挥发量。

2) 水污染物

施工期间产生的废水主要为试油废水、压裂返排液和生活污水。

(1) 井下作业废液及压裂返排液

井下作业废液和压裂返排液主要污染物为悬浮物、COD。经调查可知,本项目井下作业废液及压裂返排液共产生 343.12m³,由罐车拉运至河口采油厂埕东废液站进行处理后进入采出水处理系统处理,达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》(SY/T 5329-2022)中水质主要控制指标后回注地层,无外排。

(2) 生活污水

本项目施工期产生的生活污水,主要污染物为悬浮物、氨氮、COD,全部排入移动厕所,定期清运处置,未排入外环境。

3) 固体废物

1) 钻井固废

本项目采用“泥浆不落地”工艺,钻井过程中使用了水基泥浆,钻井固废主要包括钻井过程中无法利用或钻井完工后的废弃泥浆和岩屑,拉运至胜利油田东兴石油工程有限责任公司进行处理,钻井固废拉运量共计 2236.74m³,处理后的泥饼交由东营熙林建筑工程有限公司综合利用。泥浆不落地装置实现了泥浆收集,避免新的有害材料的添加和增量,实现了对钻井废弃物的现场减量化及无害化处理。

(2) 生活垃圾

本项目钻井期生活垃圾(22 桶)由胜利油田万和石油工程技术有限责任公司进行清运、处理;试油期生活垃圾(259kg)收集至中心垃圾点统一回收。

4) 噪声

钻井期噪声源主要是钻机、钻井泵，其源强为：80dB（A）～100dB（A）；试油期噪声源主要是通井机、压裂泵车、柴油发电机，其源强为：80dB（A）～100dB（A）。施工期现场布局合理，整体设备安放稳固，各类机泵安装了减振基座，加强施工管理和设备维护，保证设备正常运转，制定了合理的施工计划，高噪声设备分开施工，加强了对运输车辆的管理及疏导，压缩了施工区汽车数量和行车密度，减少了汽车鸣笛。

3、其他环境保护设施

本项目分别制定了《中石化胜利石油工程有限公司渤海钻井总公司突发事件应急预案》《中石化胜利石油工程有限公司井下作业公司突发事件应急预案》，根据应急预案的要求，本项目井场内存放相应应急物资和设备，并按照应急演练计划的要求，钻井及试油过程中分别对发生突发环境事件定期进行演练，并做了相应记录。

四、环境保护设施调试运行效果

1、工况记录

从现场调查和资料核实，本项目完钻的义深斜 13 探井具有油气开采价值，已移交开发单位。根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》，本项目目前满足验收条件。

2、生态保护工程和设施实施运行效果

经调查，本项目施工过程中严格规定了各类工作人员的活动范围，最大限度的减少了对植被生存环境的践踏破坏；确保了各环保设施正常运行，避免各种污染物对土壤环境的影响；未随意开设便道，无车辆乱碾乱轧的情况发生。施工结束后对临时占地进行了恢复，经调查，除转生产的井场占地，其余临时占地正在逐步恢复原地貌，且地表植被也正在逐步恢复。

3、污染防治和处置设施处理效果

1) 废气污染防治和处置措施效果

（1）施工扬尘污染防治措施效果

经资料收集可知，施工单位制定了合理化管理制度，加强管理，施工期严格控制了施工作业面积、采取了控制硬化施工道路和井场、洒水降尘、控制车辆装

载量等措施，施工扬尘未对项目周围环境空气造成不利影响。

（2）施工废气污染防治措施

经调查，施工单位制定了《设备管理制度》，加强了移动源污染防治；加强了对非道路移动机械等各类设备的维修保养，经调查项目井场位置不在《东营市人民政府关于划定和调整高排放非道路移动机械禁用区域的通告》（2022 年 12 月 23 日）所划定区域内；试油期通过临时储油罐收集返排液，储油罐采用浸没式装车，装卸车时严格控制液体流速；经资料收集及实际调查可知，项目实际严格落实了环评中大气污染防治措施，有效降低了对大气的污染。

2）废水污染防治和处置措施效果

（1）井下作业废液及压裂返排液

井下作业废液及压裂返排液拉运至埕东废液处理站进行处理后进入采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中水质主要控制指标后回注地层，无外排。

（2）生活污水

本项目施工期现场设环保厕所，生活污水排入环保厕所，定期清运，未直接外排于区域环境。

经资料收集及实际调查可知，项目实际严格落实了环评中水环境污染防治措施，废水都已转运、处理，未造成环境污染，没有环境遗留问题。

3）噪声污染防治和处置措施效果

经现场调查，项目现场布局合理，200m 范围内无声环境敏感目标；整体设备安放稳固，各类机泵安装了减振基座，加强施工管理和设备维护，保证设备正常运转，制定了合理的施工计划，高噪声设备分开施工，加强了对运输车辆的管理及疏导，压缩了施工区汽车数量和行车密度，减少了汽车鸣笛。

经资料收集及实际调查可知，项目按照环评要求落实了噪声污染防治措施。因此，本项目对周围声环境的影响较小。

4）固体废物污染防治和处置措施效果

（1）钻井固废

本项目采用“泥浆不落地”工艺，钻井过程中使用了水基泥浆，钻井固废主要包括钻井过程中无法利用或钻井完工后的废弃泥浆和岩屑，收集的废弃泥浆和岩屑拉运至胜利油田东兴石油工程有限责任公司进行处理，处理后的泥饼交由东营熙林建筑工程有限公司综合利用。泥浆不落地装置实现了泥浆收集，避免新的有害材料的添加和增量，实现了对钻井废弃物的现场减量化及无害化处理。

（2）生活垃圾

项目钻井期生活垃圾由胜利油田万和石油工程技术有限责任公司进行清运、处理；试油期生活垃圾收集至中心垃圾点统一回收。经资料收集及实际调查可知，项目按照环评要求落实了固废治理措施，设备都已搬迁，未造成环境污染，也未产生环境遗留问题。井场作业区、生活区及周边卫生环境比较清洁，无零星垃圾散布现象，井场周围植被恢复情况较好。

综上，本项目产生的各类污染物均依法合规处置，所采取的各项污染防治和处置措施运行效果良好，符合该项目环境影响报告表及其审批部门审批决定的要求。

4、其他环境保护设施运行效果

1）环境风险防范设施运行效果

经调查，验收调查期间，未发生环境风险事件。渤海钻井队针对井喷的环境风险，采取了有效的应急防范和处置措施，并定期进行演练，能及时有效应对突发环境事故的发生。

2）主要污染物排放总量

本项目不涉及。

五、建设项目对环境的影响

验收调查期间评价范围内无新增环境敏感区。据调查，义深斜 13 探井已交开发单位，工程建设对项目影响范围内的生态系统结构和功能影响较小，符合环境影响报告表及批复的要求。

根据验收调查期间对井场内外土壤的监测结果，井场内土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）

中表 2 建设用地土壤污染风险管制值（其他项目）中第二类用地的筛选值，井场外石油烃（C₁₀-C₄₀）土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中表 2 建设用地土壤污染风险管制值（其他项目）中第一类用地的筛选值。本项目井场内外石油烃（C₁₀-C₄₀）监测结果变化不大。说明义深斜 13 探井在钻井和试油过程中对周围土壤环境的影响较小。

项目无废水和有组织废气外排，不涉及总量控制指标。

六、验收建议及后续要求

- 1、更新编制依据；
- 2、完善建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表。

七、验收结论

本项目严格执行了环保“三同时”制度，建立了环境管理体系，落实了环评报告表及其批复文件中提出的相关要求，各项污染防治措施和环境风险防范措施有效可行，未对周围环境产生明显不利影响。本次验收调查期间，各项污染物均能够达标排放，符合竣工环境保护验收条件。

验收工作组认为，本项目符合竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

八、验收人员信息

见《义深斜 13 探井项目竣工环境保护验收成员表》。

何刚 王志强 王刚

验收组

2026 年 6 月 12 日

验收工作组意见复核

2026年6月12日，油气勘探管理中心组织相关人员成立验收工作组，对《义深斜13探井项目竣工环境保护验收调查报告表》进行竣工环保验收评审，并提出了整改意见，整改情况如下：

整改意见：1、更新编制依据；

整改说明：已对编制依据进行完善、更新，详见报告“表1 编制依据”。

整改意见：2、完善建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表；

整改说明：已对建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表进行完善。




胜利油田分公司油气勘探管理中心

2026年6月29日

附件 11 项目全本公示

附图 1 项目地理位置图

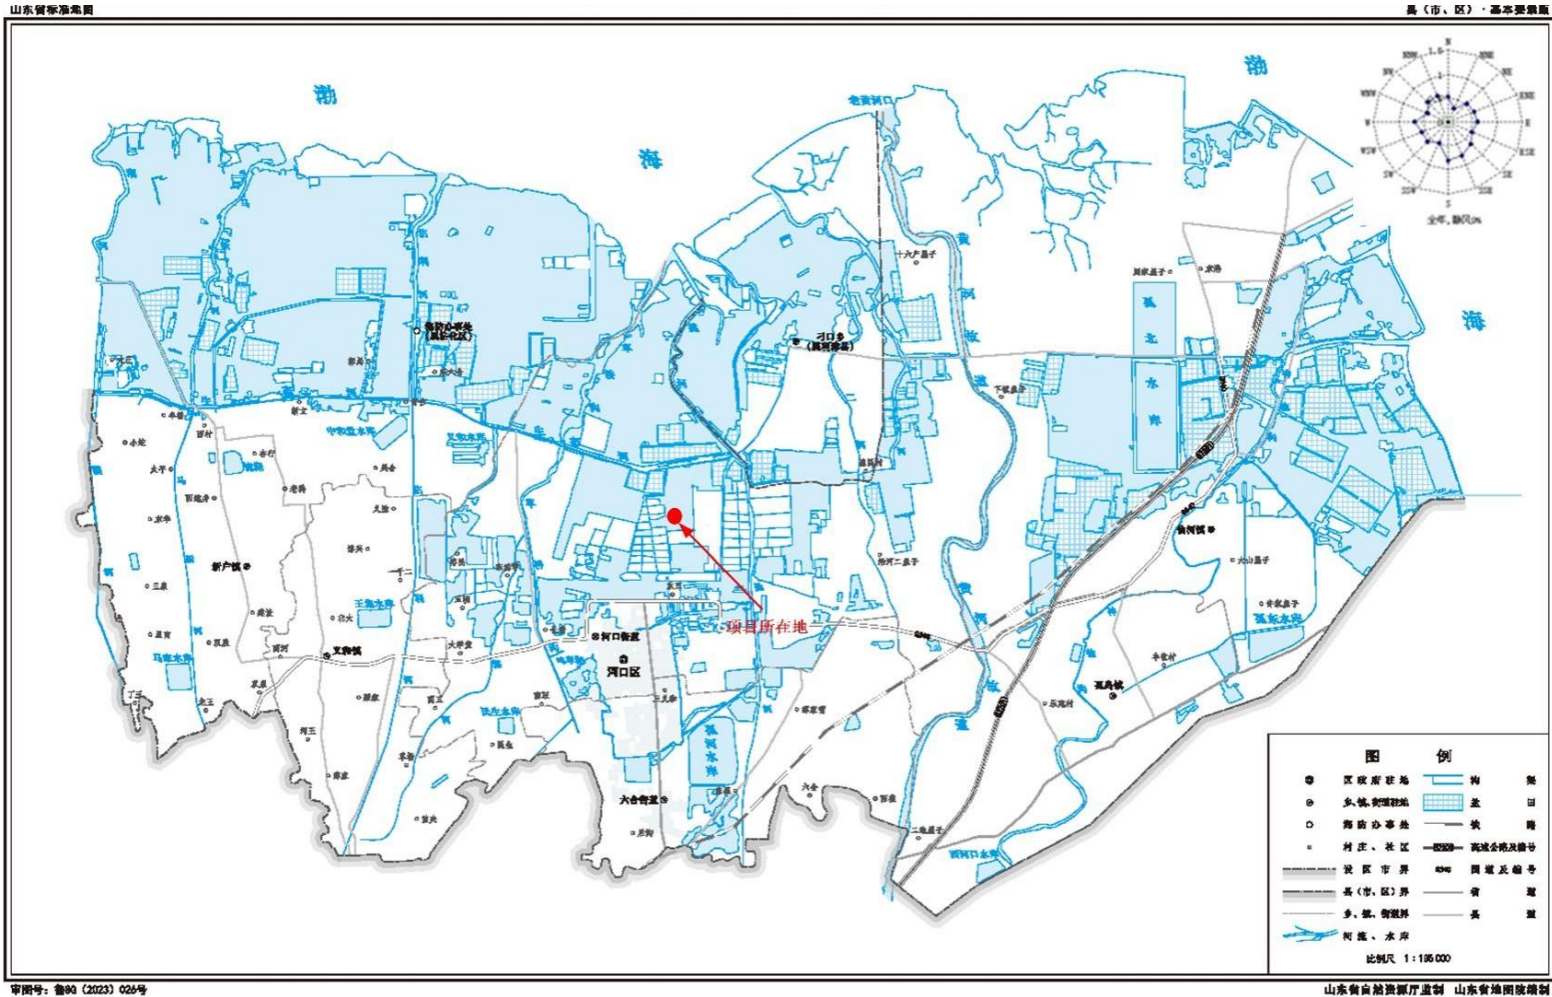

附图 2 周边关系图



建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称		义深斜 13 探井项目				项目代码		/		建设地点		山东省滨州市海防办事处东五村西北 3.45km						
	行业类别（分类管理名录）		四十六、99 陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）				建设性质		☒ 新建 ☐ 改扩建		☐ 技术改造 ☐ 分期建设，第 期		☐ 其他						
	设计生产规模		新钻义深斜 13 井 1 口，设计钻深 5033.11m				实际生产规模		完钻义深斜 13 井 1 口，实际钻深 4932m		环评单位		森诺科技有限公司						
	环评文件审批机关		滨州市行政审批服务局				审批文号		滨审批四表[2024]380500019 号		环评文件类型		环境影响报告表						
	开工日期		2025 年 3 月 8 日				竣工日期		2026 年 4 月 28 日		排污许可证申领时间		/						
	建设地点坐标（中心点）		*保密*				线性工程长度（km）		/		起始点经纬度		/						
	设计单位		中石化胜利石油工程有限公司钻井工艺研究院				施工单位		中石化胜利石油工程有限公司渤海钻井总公司		本工程排污许可证编号		/						
	验收单位		中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心				环境保护调查单位		山东胜丰检测科技有限公司		验收调查时工况		已移交开发单位						
	投资总概算（万元）		2517				环境保护投资总概算（万元）		142.4		所占比例（%）		5.66						
	实际总投资（万元）		2470				实际环境保护投资（万元）		135		所占比例（%）		5.47						
	废水治理（万元）		48	废气治理（万元）		1.0	噪声治理（万元）		5	固体废物治理（万元）		68.5		绿化及生态（万元）		4.5	其他（万元）		8
	新增废水处理设施能力		/				新增废气处理设施能力		/		年平均工作时		/						
运营单位			中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司油气勘探管理中心				运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）			91370500723856718W		验收时间		2026 年 7 月					
污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排放量（1）	本期工程实际排放浓度（2）	本期工程允许排放浓度（3）	本期工程产生量（4）	本期工程自身削减量（5）	本期工程实际排放量（6）	本期工程核定排放总量（7）	本期工程“以新带老”削减量（8）	全厂实际排放总量（9）	全厂核定排放总量（10）	区域平衡替代削减量（11）	排放增减量（12）						
	废水																		
	化学需氧量																		
	氨氮																		
	石油类																		
	废气																		
	SO ₂																		
	NO _x																		
	颗粒物																		
工业固体废物																			
其他特征污染物																			
生态影响及其环境保护设施（生态类项目详填）	主要生态保护目标	名称	位置	生态保护要求		项目生态影响		生态保护工程和设施		生态保护措施		生态保护效果							
	生态敏感区																		
	保护生物																		
	土地资源	工矿仓储用地	永久占地面积			恢复补偿面积				恢复补偿形式									
			永久占地面积			恢复补偿面积				恢复补偿形式									
	生态治理工程		工程治理面积			生物治理面积				水土流失治理率									
其他生态保护目标																			

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万 t/年；废气排放量——万标立方 m/年；工业固体废物排放量——万 t/年；水污染物排放浓度——毫克/升。4、主要生态保护对象依据环境影响报告书（表）和验收要求填写，列表为可选对象。

86
